

Gabinete do Prefeito

UGP - BID

**Unidade de Gerenciamento do
Programa de Estruturação Urbana de
SJC Campos / BID (PEU)**

Relatório de Transição de Governo



**MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**



UGP – BID

**PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**


Contrato de Empréstimo Nº 2323/OC-BR

Relatório do progresso das atividades

21 de outubro de 2016



**MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**



UGP – BID

**PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO URBANA DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**

Contrato de Empréstimo Nº 2323/OC-BR

Relatório do progresso das atividades

21 de outubro de 2016

Rosa Siqueira
Coordenadora Operacional
UGP/BID
PMSJC - SP

Antonio Arthur de Queiroz
UGP/BID
PMSJC - SP



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	4
2	INTRODUÇÃO	5
2.1	Objetivo	5
2.2	Descrição do Programa	5
2.2.1	Componente 1: Melhorias Urbanas-Ambientais	6
2.2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade Urbana	6
2.2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	7
2.3	Custo do Programa	8
2.4	Execução	8
2.5	Manutenção	8
3	MAPA DE LOCALIZAÇÃO	9
4	CONTROLE FÍSICO E FINANCEIRO	10
4.1	Total do Programa	10
4.2	Controle Físico dos Projetos e Obras	11
4.3	Quadro de Acompanhamento Físico-Financeiro	12
4.4	Situação Física-Financeira do Programa	16
5	CUSTO DO PROGRAMA	17
5.1	Plano de Execução do Programa	17
5.2	Quadro de Origem e Aplicação de Recursos Anual	19
5.3	Cronograma de Investimentos	21
6	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	25
6.1	Unidade de Gerenciamento do Programa	25
6.2	Gerenciamento do Programa	25
6.2.1	EQUIPE TÉCNICA PARA O GERENCIAMENTO	25
7	ASPECTOS LICITATÓRIOS	26
7.1	Administração do Programa	26
7.1.1	Auditoria, Monitoramento e Avaliação, UGP, Fiscalização	26
7.2	Custos Diretos: Componente 1 – Melhorias Urbano-Ambientais	28
7.2.1	Parques Urbanos	28
7.2.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos	29
7.2.3	Regularização de Loteamentos	30
7.3	Custos Diretos: Componente 2 – Melhorias na Mobilidade da População	32
7.3.1	Obras Viárias	32
7.3.2	Gestão do Trânsito – Controle Central de Operações	34



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

7.3.3	Prédio do Controle Central de Operações	35
7.3.4	Sistema Integrado de Transporte Público	35
7.3.5	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes	36
7.3.6	Transporte Rápido de Massa – TRM	36
7.3.7	Projetos de Engenharia	36
7.4	Custos Diretos: Componente 3 – Fortalecimento Institucional	37
7.4.1	Gestão de Tecnologia da Informação	37
7.4.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação	37
7.4.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico	38
7.4.4	Gestão Cadastral	39
7.5	Plano de Aquisições	39
8	CLÁUSULAS CONTRATUAIS	39
9	ASPECTOS TÉCNICOS	41
9.1	Cronograma de Execução das Obras do Programa	41
10	ASPECTOS FINANCEIROS	44
10.1	Quadro de Investimento por Categoria de Inversão	44
10.2	Quadro de Controle de Desembolso	44
10.3	Quadro do Saldo Não Desembolsado	44

ANEXO A – Mapa do Programa de Estruturação Urbana de São José Dos Campos - SP

ANEXO B – Plano de Aquisições do Programa

ANEXO C – Programação Física da Execução Futura do Programa



1 APRESENTAÇÃO

O Programa de Estruturação Urbana tem como objetivo contribuir para a estruturação e ordenamento do desenvolvimento urbano do Município de São José dos Campos. Para atingir esta meta, a Administração pretende utilizar um conjunto de produtos, composto por: projetos ambientais; projetos de infraestrutura urbana; gestão de transporte; e fortalecimento institucional.

Para a implementação do referido Programa, a Prefeitura do Município conta com o suporte financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, através do contrato acima citado.

O presente relatório foi elaborado com o propósito de informar o andamento das atividades desenvolvidas durante a vigência do contrato e está composto por:

- Apresentação;
- Mapa de localização;
- Controle físico-financeiro;
- Custos do Programa;
- Aspectos administrativos;
- Aspectos licitatórios;
- Aspectos técnicos;
- Aspectos financeiros;
- Plano de aquisições atualizado;
- Cláusulas contratuais; e
- Anexos.



2 INTRODUÇÃO

O contrato celebrado no dia 18 de agosto de 2011 entre o Município de São José dos Campos do Estado de São Paulo, da República Federativa do Brasil, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID firma a cooperação das duas partes na execução do Programa de Estruturação Urbana – PEU de São José dos Campos.


2.1 Objetivo

O objetivo geral do Programa consiste em contribuir para a estruturação e ordenamento do desenvolvimento urbano do Município de São José dos Campos, através de um conjunto de projetos ambientais, de infraestrutura urbana, de gestão de transporte e de fortalecimento institucional. Deste modo, busca-se a contribuição para o planejamento integrado e o desenvolvimento mais equilibrado no âmbito econômico, ambiental e social da cidade.

2.2 Descrição do Programa

Desde o pleito de alteração contratual enviado à Comissão de Financiamentos Externos – COFLEX, órgão colegiado integrante da estrutura organizacional da Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAIN, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – MP, em de 14 de julho de 2016, trabalha-se com as atividades descritas nos “Itens 2.2.1 a 2.2.3”, considerando-se o **prazo final de desembolsos em fevereiro de 2019**. Trata-se do segundo pleito de alteração contratual, tendo sido o primeiro feito em 2015, em que foram feitas transferências de atividades previstas nos componentes do Programa.

Algumas dessas mudanças no contrato são importantes destacar, primeiramente, a atividade prevista de *Remanejamento das Famílias do Banhado* foi retirada do Programa em razão da impossibilidade de concluir um Plano de Reassentamento em acordo com a comunidade e o BID. Ressalta-se que, desde 2011 vinha sendo mantido diálogo intermediado pelo Mecanismo Independente de Consulta e Investigação (MICI), o qual foi interrompido por solicitação da Comissão de Moradores. A obra de implantação da *Via do Banhado*, a Prefeitura tomou a decisão de não executar com recursos BID em virtude de uma série de dificuldades, entre elas: i) a mencionada dificuldade de diálogo com a



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

comunidade local para fins de remoção e realocação das habitações das famílias que ocupam área localizada no traçado da futura via; ii) obstáculos na obtenção do licenciamento ambiental; fatos que implicaram na retirada da obra do Programa e na busca de recursos em outras fontes para a execução da Via Banhado.

2.2.1 Componente 1: Melhorias Urbanas-Ambientais

Este componente tem por objetivo melhorar a qualidade urbano-ambiental do Município e consolidar a integração entre o espaço urbano e o de preservação, através das seguintes intervenções:

- Implantação e/ou melhoria de três Parques Urbanos dentre os parques urbanos constantes do Plano Diretor do Município adotado pela Lei Complementar Municipal nº. 306/2006, de modo a aumentar o índice de áreas verdes em áreas urbanas carentes e melhorar a permeabilidade do solo urbano;
- Regularização urbanística dos loteamentos clandestinos de Jardim dos Coqueiros, Chácaras Araújo, Michigan, Santa Hermínia, Santa Maria, Primavera, Pousada do Vale e Majestic, onde vivem famílias em condições de infraestrutura precária, e o encaminhamento dos respectivos processos aos órgãos competentes para sua legalização;
- Implantação de 12 PEVs, contribuindo para o cumprimento da Lei Municipal nº 7146/2006 que institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos;
- Execução das obras de Canal Aberto do Córrego Lavapés para captação de águas pluviais ao longo da Avenida Teotônio Vilela e;
- Execução das obras de Drenagem do Jardim Augusta.

2.2.2 Componente 2: Melhorias na Mobilidade Urbana

Este componente tem por objetivo melhorar a mobilidade de pessoas e mercadorias na cidade, mediante a reestruturação de alguns corredores e trechos do sistema viário, descongestionando áreas problemáticas, aumentando a eficiência do transporte público coletivo, expandindo as ciclovias e melhorando a segurança do trânsito. Estão previstos os seguintes projetos:



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

- Obras de implementação de dois corredores viários (Cambuí e Ligação Leste-Sudeste, de extensão aproximada de 7 km e 17,5 km, respectivamente);
- Construção de uma Estação de Conexão de Ônibus – ECO que será parte do Sistema Integrado de Transporte Público que está sendo implantado pela Prefeitura;
- Apoio à modernização do sistema de semáforos e implantação do Centro de Controle de Operações Viárias;
- Estudo de alternativas de um sistema de Transporte Rápido de Massa – TRM;
- Duplicação da Ponte Maria Peregrina e do Viaduto Kanebo;
- Prolongamento da Rua Saigiro Nakamura;
- Ampliação da Malha Cicloviária;
- Requalificação Urbana – Novo Centro e;
- Projetos de Engenharia da Malha Cicloviária e da Ligação Leste-Sudeste.

2.2.3 Componente 3: Fortalecimento Institucional

Este componente apoiará o objetivo estratégico do governo municipal de aumentar a eficiência e a eficácia do setor público mediante o aperfeiçoamento dos serviços públicos municipais, da administração pública e da gestão territorial. O fortalecimento institucional está estruturado em dois subcomponentes: Gestão de Tecnologia da Informação na administração municipal; e Gestão Cadastral e de Serviços Eletrônicos. Serão assim financiados:

- Um Plano Diretor de Informática, e uma Biblioteca de Metadados;
- Ações de melhorias em recursos materiais e humanos de Tecnologia da Informática, compreendendo a aquisição de equipamentos e serviços de capacitação;
- Ações de aperfeiçoamento de serviços de Governo Eletrônico, compreendendo a aquisição em mercado de soluções e sistemas informáticos; e
- A reestruturação e atualização cadastral, que será responsável pela integração das bases de dados, migração de legados e ações de levantamento e atualização cadastral.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

2.3 Custo do Programa

O valor total do Programa é de US\$ 178.026.200,00, sendo US\$ 85.672.400,00 (48,1%) de financiamento pelo BID e US\$ 92.353.800,00 (51,9%) de contrapartida local.

2.4 Execução

O Órgão Executor é o Município de São José dos Campos. Para auxiliar na execução do Programa, foi constituída a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, vinculada à Assessoria de Projetos Estratégicos do Gabinete do Prefeito, a qual será mantida durante toda a execução do Programa.

2.5 Manutenção

O propósito da manutenção é o de conservar adequadamente as obras e equipamentos compreendidos no Programa, dentro de um nível compatível com o serviço que devem prestar. O relatório anual de manutenção deverá incluir:

- Um inventário atualizado das obras e equipamentos do Programa;
- Os contratos de manutenção vigentes, seu prazo, sua cobertura e seu grau de execução; e
- O plano de manutenção para o exercício fiscal seguinte, com justificação das prioridades estabelecidas, das atividades a serem realizadas, do cronograma de execução e do orçamento.

Por fim, as obras executadas com recursos do Programa serão mantidas pelo Município de São José dos Campos.





UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

3 MAPA DE LOCALIZAÇÃO

As figuras a seguir apresentam a localização do Município de São José dos Campos no Estado de São Paulo e o mapa do PEU visto de uma forma simplificada. O Anexo A repete este último, porém em um tamanho superior.

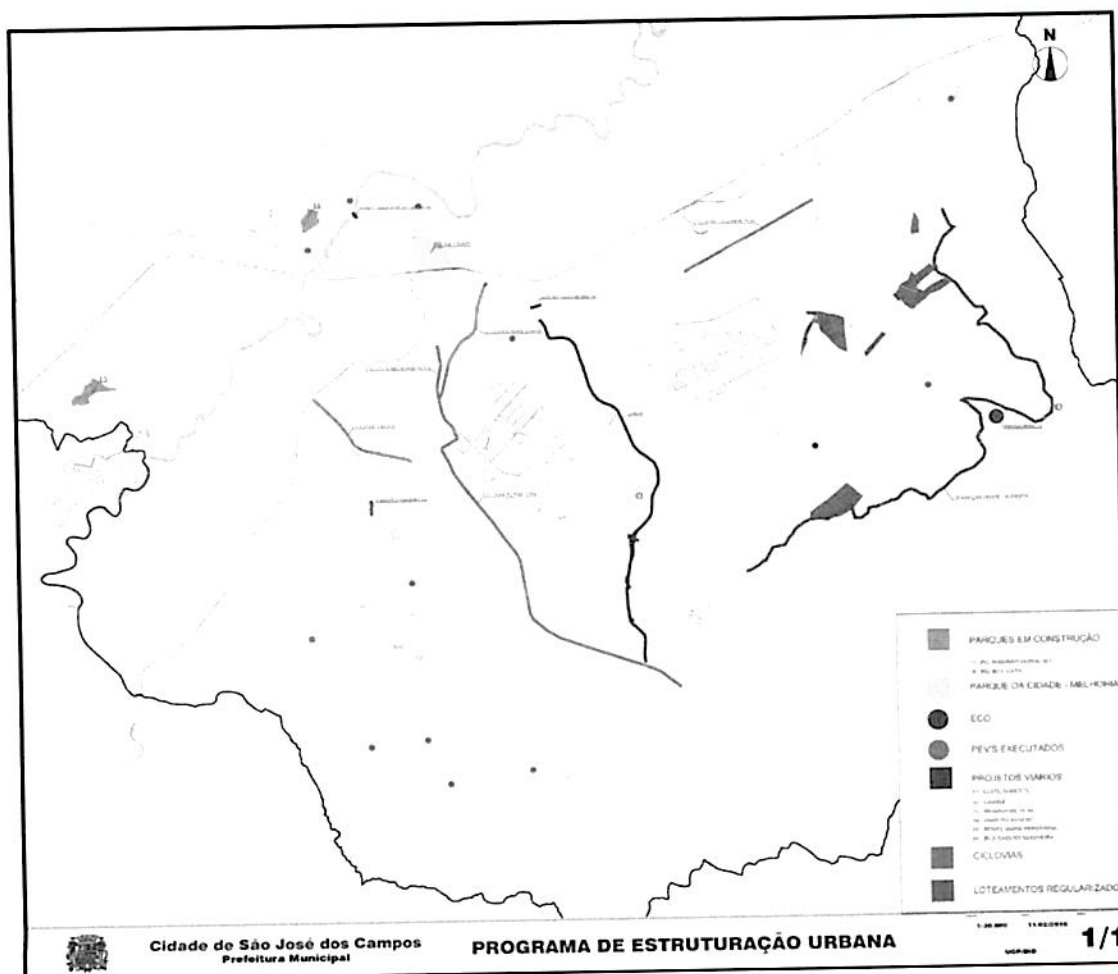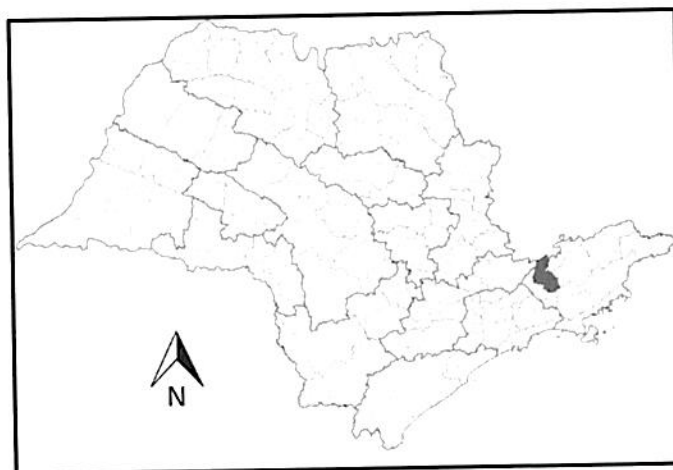




UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

4 CONTROLE FÍSICO E FINANCEIRO

4.1 Total do Programa

CATEGORIA DE INVESTIMENTO		PARTICIPAÇÃO
1.	Administração do Programa	3,17%
2.1	Melhorias Urbano-Ambientais	18,81%
2.2	Melhorias na Mobilidade da População	69,57%
2.3	Fortalecimento Institucional	8,45%
TOTAL DO PROGRAMA		100,00%

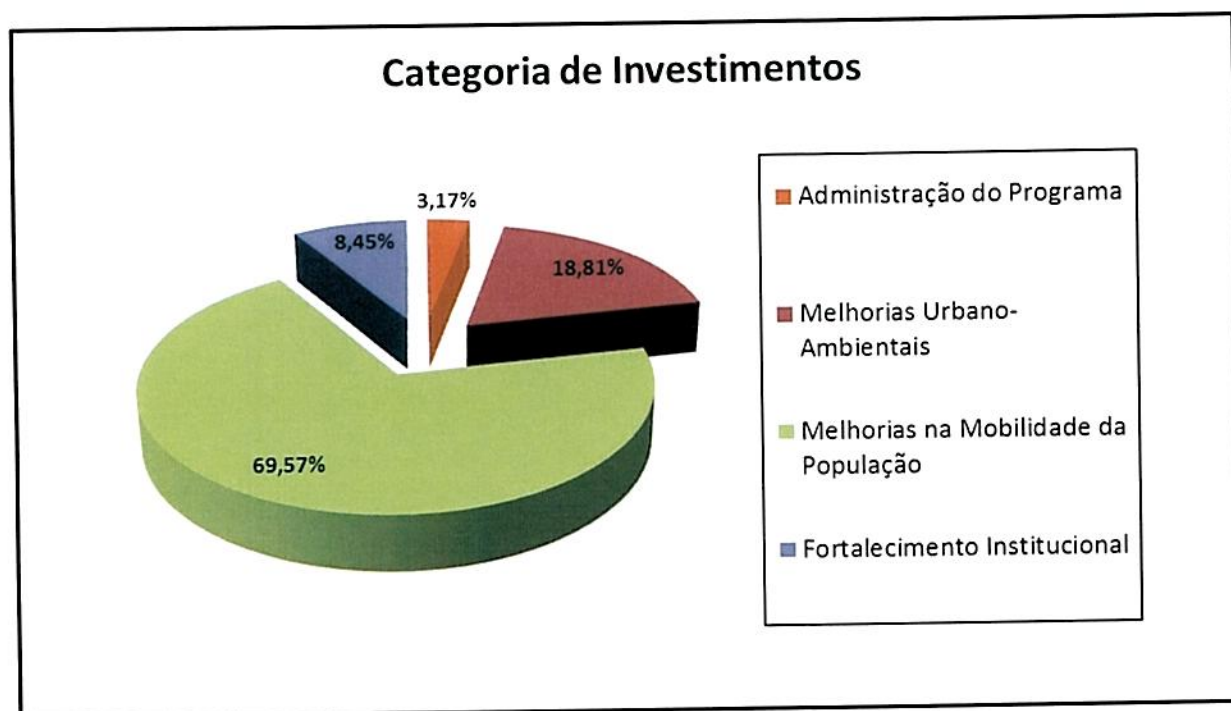



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

4.2 Controle Físico dos Projetos e Obras

a. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		CONTRATOS	%
a.1.	Auditoria, Monitoramento, Avaliação, UGP, Fiscalização		
a.1.1.	Concluídos	12	85,71
a.1.2.	Em andamento	1	7,14
a.1.3.	Não iniciados	0	0,00
a.1.4.	Contratos em licitação	0	0,00
a.1.5.	Contratos a licitar	1	7,14
	TOTAL	14	100,00
b. CUSTOS DIRETOS		CONTRATOS	%
b.1.	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais		
b.1.1.	Concluídos	26	30,59
b.1.2.	Em andamento	4	4,71
b.1.3.	Não iniciados	0	0,00
b.1.4.	Contratos em licitação	1	1,18
b.1.5.	Contratos a licitar	1	1,18
b.2.	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População		
b.2.1.	Concluídos	27	31,76
b.2.2.	Em andamento	3	3,53
b.2.3.	Não iniciados	0	0,00
b.2.4.	Contratos em licitação	0	0,00
b.2.5.	Contratos a licitar	2	2,35
b.3.	Componente 3: Fortalecimento Institucional		
b.3.1.	Concluídos	19	22,35
b.3.2.	Em andamento	1	1,18
b.3.3.	Não iniciados	0	0,00
b.3.4.	Contratos em licitação	0	0,00
b.3.5.	Contratos a licitar	1	1,18
	TOTAL	85	100,00



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

4.3 Quadro de Acompanhamento Físico-Financeiro

ITEM	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DESCRIÇÃO	EMPRESA	CONTRATO	PRAZOS (meses)		VALOR DO CONTRATO (USD)	VALOR ESTIMADO (USD)	VALOR PAGO (USD)	SITUAÇÃO	AVANÇOS	
				Contr.	Atual.					PM (%)	PIS (%)
1.1	Auditoria, Monitoramento, Avaliação, UGP Fiscalização										
1.1.1	UGP										
1.1.1.1	Infraestrutura Física da UGP										
1.1.1.1.1	Compra de Equipamentos 1	Petlaert & Garcia - Gestos Acordeados LTDA-ME	24890/11	12	12	7.622,92	4.185,14	6.681,73	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.2	Compra de Equipamentos 2	Itaúres S.A.	24878/11	12	12	4.071,14	2.232,25	3.563,87	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.3	Compra de Equipamentos 3	Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática LTDA	24846/11	6	6	1.406,97	782,60	1.249,46	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.4	Compra de Equipamentos 4	Requinte Com. de Aces. p/ Móveis e Dec. LTDA-ME				782,13	489,89	782,13	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.5	Compra de Equipamentos 5	Suprinet Suprimentos para Informática LTDA				281,86	176,55	281,86	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.6	Compra de Equipamentos 6	Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA - ME				147,08	92,12	147,08	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.7	Compra de Equipamentos 7	Diego Koloszk Henevha Móveis - EPP				3.169,46	1.985,21	3.169,46	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.8	Compra de Equipamentos 8	CLK Com. Serv. de Equip. p/ Segurança e Informática e Construção Civil LTDA-ME				157,41	98,60	157,41	Concluído	100,00	100,00
1.1.1.1.9	Compra de Equipamentos 9	NET MD Automação Industrial e Informática LTDA - EPP				1.239,61	776,44	1.239,60	Concluído	100,00	100,00
1.1.2	Fiscalização das Obras Várias						3.303.030,30		A licitar	0,00	0,00
1.1.3	Monitoramento e Avaliação										
1.1.3.1	Contratação de Empresa de Consultoria	Lincen Aveleiro de Barros	300/14	4	12	35.530,27	24.433,08	31.912,08	Concluído	100,00	100,00
1.1.3.2	Estudo de Viabilidade Econômica da Via Cambuí	Luiz Cláudio de Souza Faria	2408/15	3	3	18.393,28	20.027,11	21.008,40	Concluído	100,00	100,00
1.1.3.3	Estudo de Viabilidade Econômica da Via Cambuí e Rua Sujeiro	Luiz Cláudio de Souza Faria	464/16	1	1	18.317,60	20.027,11	18.186,90	Concluído	100,00	100,00
1.1.4	Auditoria Anual	Louren Blomquist	28057	25	25	181.419,40	114.046,71	101.673,73	Em Andamento	89,15	72,00
1.1.5	Apoio ao Gerenciamento						2.018.348,00		A licitar	0,00	0,00
				SUBTOTAL		272.539,12	5.510.731,11	190.053,70			
				DIFERENÇA		5.365.974,88	127.782,89				
				TOTAL VIGENTE		5.638.514,00					
				TOTAL ORIGINAL		5.638.514,00					
								3.37		68,00	



Unidade de Gerenciamento do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

DIFERENÇA	6.078.773,44			
TOTAL VIGENTE	33.482.354,04		20.174.064,72	
TOTAL ORIGINAL	33.482.354,04			60,25
				69,42



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID


ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CONTRATO	PRAZOS (meses)			VALOR DO CONTRATO [USD]	VALOR ESTIMADO [USD]	VALOR PAGO [USD]	SITUAÇÃO	AVANÇOS	
				Contr.	Atual.	Decor.					FIN [%]	FS[%]
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População											
2.2.1	Obras Várias											
2.2.1.1	Via Oeste	Deita Construções S/A	18029/08	6	6	6	3.312.980,36	1.798.784,20	1.557.296,09	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.2	Viaduto Santa Inês											
2.2.1.2.1	Execução das Obras 1	CCI Construções S/A	18832/08	8	20	20	6.939.078,36	3.575.156,16	5.172.524,86	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.2.2	Execução das Obras 2	Eletronet Com. e Serviços de Eletricidade LTDA	22819/10	3	3	3	115.066,93	62.238,11	105.444,29	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.3	Via Norte											
2.2.1.3.1	Execução das Obras 1	Deita Construções S/A	18628/08	12	32	32	9.502.095,77	5.159.167,23	9.135.689,15	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.3.2	Execução das Obras 2	R & B Construção e Manutenção LTDA - EPP	24416/11	1	1	1	113.629,81	56.611,84	98.382,63	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.3.3	Logística	MMS Logística S/A	22737/10	6	6	6	368.831,00	202.097,93	327.763,89	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.3.4	Desapropriações											
2.2.1.4	Via do Banhado - Projeto (Obras fora do Programa)	Planervi Engenharia LTDA e COBRAPE	27843	8	8	8	2.275.283,24	1.438.453,36	1.321.278,58	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.5	Sistema Vário Cambuí-Saigiro Nakamura											
2.2.1.5.1	Projeto e Licenciamento Ambiental	Consórcio Projeto Via Cambuí	27913	22	24	24	2.795.976,72	1.794.521,54	1.406.067,75	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.5.2	Desapropriações Via Cambuí									Em Andamento	7,19	7,19
2.2.1.5.3	Desapropriações Prolongamento da Rua Saigiro Nakamura											
2.2.1.5.4	Execução das Obras									A Licitar	0,00	0,00
2.2.1.6	Duplicação Viaduto Kabebo											
2.2.1.6.1	Duplicação Viaduto Kabebo - Bairro Centro	Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi LTDA	1423/15	12	12	9	3.611.751,82	3.532.185,56	3.658.777,54	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.6.2	Duplicação Viaduto Kabebo - Centro-Bairro	Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi LTDA	24809/11	8	29	29	3.417.630,00	3.239.584,05	2.787.068,25	Concluído	100,00	100,00
2.2.1.7	Duplicação da Ponte Maria Peregrina	Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi LTDA	621/16	15	15	2	4.489.226,40	4.521.331,17		Em Andamento	0,00	0,00
2.2.1.9	Ampliação da Malha Cicloviária									A Licitar	0,00	0,00
2.2.1.10	Ligação Leste-Sudeste	Souza Compex Engenharia Construções	418/16	6	6	6	5.742.112,42	10.878.787,88	2.878.001,73	Em Andamento	46,09	86,22
2.2.1.14	Requalificação Urbana - Novo Centro	Stemmi Engenharia e Construções LTDA	205/16	6	6	5	3.167.713,02	6.244.211,10	3.033.997,70	Concluído	92,85	100,00
2.2.2	Gestão do Trânsito - Controle Central de Operações											
2.2.2.1	Centrais Semafóricas											
2.2.2.1.1	Compra de Centrais Semafóricas 1	Tec-Sistemas de Controle LTDA	21731/10	12	12	12	58.872,01	32.179,65	27.564,94	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.1.2	Compra de Centrais Semafóricas 2	Brascontrol Indústria e Comércio LTDA	21740/10	12	12	12	101.059,46	56.604,63	45.844,93	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.1.3	Software de Integração das Centrais Semafóricas	TRANZUM Planejamento e Consultoria de Trânsito S/S LTDA	28569/13	12	22	22	358.102,24	221.298,27	342.356,60	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.1.3	Software Tempo Real	Digicon S.A.	26991	4	4	4	996.646,88	620.908,31	1.075.248,78	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.2	Prédio do Controle Central de Operações											
2.2.2.2.1	Compra de Equipamentos Servidores 1	Dalcom do Brasil Tecnologia e Infra-estrutura LTDA	29524	2	2	2	20.487,05	14.696,82	23.567,19	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.2.2	Compra de Equipamentos Servidores 2	Full Prime Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME	27668	1	1	1	59.236,77	36.970,05	59.283,60	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.2.3	Compra de Equipamentos Servidores 3	Guimarães e Marques Suprimentos para Informática LTDA - EPP	27628	1	1	1	3.870,63	2.424,51	3.887,85	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.2.4	Compra de Equipamentos Servidores 4	Sentran Serviços Especializados de Trânsito LTDA	20632/09	2	2	2	63.505,07	38.205,57	66.395,37	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.2.5	Compra de Equipamentos Servidores 5	Sentran Serviços Especializados de Trânsito LTDA	22272/10	2	2	2	98.104,60	52.331,92	90.944,79	Concluído	100,00	100,00
2.2.2.2.6	Montagem da Sala CCO	GAS Monitoramento e Sistemas LTDA	27895	4	4	4	721.810,93	468.634,46	751.482,22	Concluído	100,00	100,00
2.2.3	Sistema Integrado de Transporte Público											
2.2.3.1	ECO - Campos de São José	Paulo Goul Engenharia LTDA	21253/09	3	3	3	105.021,14	58.377,08	101.449,90	Concluído	100,00	100,00
2.2.3.3	Sistema de Gestão de Transportes Concedidos	Declink Desenvolvimento e Consultoria de Informática LTDA	29743/13	48	48	48	323.945,48	231.580,70	155.143,07	Concluído	100,00	100,00
2.2.3.5	Software de Mapas dos Pontos de Ônibus	LOGANN Soluções em Tecnologia de Automação e Informação LTDA	26124	14	14	14	72.574,04	38.205,57	68.911,29	Concluído	100,00	100,00
2.2.4	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes											
2.2.4.1	Melhorias de Recursos Materiais	Trafeg Soluções e Segurança de Trânsito LTDA	0775/15	12	12	12	145.223,55	120.717,52	120.717,52	Concluído	100,00	100,00
2.2.4.2	Campaña de Educação de Trânsito											
2.2.4.2.1	Consultoria	Em Trânsito Consultoria	021/14	12	12	12	49.817,82	35.808,48	51.401,18	Concluído	100,00	100,00
2.2.5	TRM											
2.2.5.1	Estudos sobre modal para TRM	Fundação Casimiro Montenegro Filho	20282/09	7	7	7	21.029,57	14.789,25	25.701,44	Concluído	100,00	100,00
2.2.6	Projetos de Engenharia (Malha Cicloviária e Ligação Leste-Sudeste)	SGS Enger Engenharia LTDA	656/14	12	12	12	1.198.211,59	819.432,60	697.327,80	Concluído	100,00	100,00
				SUBTOTAL								
				DIFERENÇA								
				TOTAL VIGENTE								
				TOTAL ORIGINAL								



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	CONTRATO	PRAZOS (meses)		VALOR DO CONTRATO (USD)	VALOR ESTIMADO (USD)	VALOR PAGO (USD)	SITUAÇÃO	AVANÇOS	
				Contr.	Atual.					PM (%)	PIS (%)
2.3	Componente 3: fortalecimento institucional										
2.3.1	Gestão de Tecnologia da Informação										
2.3.1.1	Plano Diretor de Informática	Rhino Consultoria	25930/12	7	7	101.966,79	55.428,89	88.494,27	Concluído	100,00	100,00
2.3.1.2	Biblioteca de Metadados	Systhemis Comércio de Software LTDA	25889/12	6	6	91.979,81	50.525,95	80.512,01	Concluído	100,00	100,00
2.3.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação										
2.3.2.1	Sistema de Armazenamento e Processamento de Dados										
2.3.2.1.1	Equipamentos Servidores 1	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S.A.	41/2014	2	2	28.491,20	21.259,55	31.062,89	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.2	Equipamentos Servidores 2	PHD Sistemas de Energia	07214	2	2	39.403,44	28.654,18	41.867,37	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.3	Software - SO e Virtualização 1	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S.A.	28889	1	1	128.486,65	87.687,21	152.220,33	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.4	Software - SO e Virtualização 2	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática LTDA	28898	1	1	56.796,43	38.665,50	62.003,95	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.5	Equipamentos Backbone	ACTV Comércio e Serviços LTDA EPP	00714	2	2	375.302,66	276.990,39	404.717,96	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.6	Equipamentos - Geradores, AC, Nobreaks	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S.A.	29514/13	2	2	979.660,68	663.503,20	514.660,94	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.7	Desenvolvimento de Sistemas	Positivo Informática S.A.				4.592,45	4.253,61	4.592,45	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.8	Compra de Equipamentos Storage	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S.A.	29514/13	2	2	66.768,87	35.896,29	355.335,61	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.1.9	Compra de Servidor de Rede	Mogi Trading Comércio de Aparelhos LTDA - ME	21581/09	1	1			62.382,20	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.2	Sistema Gerenciador de Banco de Dados	Cito Tecnologia S.A.	28790	1	1	1.254.154,74	835.425,17	1.323.616,57	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.2.1	Compra de Sistema Oracle Enterprise	Bertini do Brasil S.A.	21571/09	1	1	95.450,64	78.367,18	217.819,67	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.2.2	Sistema de Segurança de Dados Backup Site										
2.3.2.4.1	Compra de Equipamentos Storage	Officer Distribuidora de Produtos de Informática S.A.	29514/13	2	2	99.462,48	109.975,21	99.462,48	Concluído	100,00	100,00
2.3.2.4.2	Compra de Equipamentos Servidores	Daten Tecnologia LTDA	14840/14	1	1	96.620,09	78.879,80	115.180,30	Concluído	100,00	100,00
2.3.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico										
2.3.3.1	Gestão Fiscal Integrada - Novo SIF	Kerion Engenharia e Sistemas S.A.	21359/09	36	36	3.187.583,28	1.726.182,02	2.300.146,17	Concluído	100,00	100,00
2.3.3.2	Sistema de ISS Eletrônico	Eicon Controles Inteligentes de Negócios LTDA	19486/08	24	24	1.143.916,51	769.965,49	1.338.080,95	Concluído	100,00	100,00
2.3.3.6	Solução Tecnológica de Gestão Financeira	NTC - Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática LTDA	679/16	24	24	6.187.663,62	7.508.769,76		Em Andamento	0,00	4,17
2.3.5	Gestão Cadastral										
2.3.5.1	Reestruturação Cadastral	Rogério Thomé	27822	7	7	21.179,21	13.458,22	21.581,02	Concluído	100,00	100,00
2.3.5.3	Indicação e Digitalização de Mapas e Documentos	Digitar Digitalização Transportes e Comércio LTDA ME	27594	12	12	126.557,30	79.184,10	105.561,20	Concluído	100,00	100,00
2.3.5.5	Pesquisa Socioeconômica						219.881,65	7.319.301,34	A Licitar	0,00	0,00
						SUBTOTAL	14.035.534,85	12.672.468,48			
						DIFERENÇA	1.011.917,64	2.375.044,01			
						TOTAL VIGENTE	15.047.452,49	7.319.301,34		48,64	83,68
						TOTAL ORIGINAL	15.047.452,49				



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

4.4 Situação Física-Financeira do Programa

ITEM	CATEGORIA DE INVESTIMENTO	PESO DO COMPONENTE [%]	AVANÇOS DO COMPONENTE	
			FINANCEIRO [%]	FÍSICO [%]
1.	Administração do Programa	3,17	3,37	68,00
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	18,81	60,25	69,42
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	69,57	30,54	86,10
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	8,45	48,64	83,68
TOTAL DO PROGRAMA		100,00	36,80	82,18



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

5 CUSTO DO PROGRAMA

5.1 Plano de Execução do Programa

O valor do Programa é equivalente a US\$ 178.026.200,00, subdivididos em duas categorias de inversão: Administração do Programa, no valor de US\$ 5.638.514,00; e Custos Diretos, com US\$ 172.387.686,00 correspondentes. Os subcomponentes contemplados por estes números são mostrados nos dois quadros a seguir:

Cód.	Descrição	BID (US\$)	PMSJC (US\$)	TOTAL (US\$)
1	Administração do Programa	3.615.688,00	2.022.826,00	5.638.514,00
1.1	Auditoria, Monitoramento, Avaliação, UGP, Fiscalização	3.615.688,00	2.022.826,00	5.638.514,00
1.1.1	UGP	-	17.272,59	17.272,59
1.1.2	Fiscalização das Obras Viárias	3.303.030,00	-	3.303.030,00
1.1.3	Monitoramento e Avaliação	71.107,38	-	71.107,38
1.1.4	Auditoria Anual	241.550,62	-	241.550,62
1.1.5	Apoio ao Gerenciamento	-	2.005.553,41	2.005.553,41
2	Custos Diretos	82.056.712,00	90.330.974,00	172.387.686,00
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	23.122.448,86	10.359.905,18	33.482.354,04
2.1.1	Parques Urbanos	11.674.537,02	22.496,78	11.697.033,80
2.1.1.1	Centro de Lazer Ribeirão Vermelho	3.786.738,00	22.496,78	3.809.234,78
2.1.1.2	Parque Boa Vista	6.744.638,02	-	6.744.638,02
2.1.1.3	Parque Roberto Burle Marx	1.143.161,00	-	1.143.161,00
2.1.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos	560.552,14	402.802,50	963.354,64
2.1.2.1	Fase 1	-	349.094,49	349.094,49
2.1.2.2	Fase 2	560.552,14	4.321,72	564.873,86
2.1.2.3	Fase 3 - PEV Jardim Copacabana	-	49.386,29	49.386,29
2.1.3	Regularização de Loteamentos	5.806.982,70	6.755.984,01	12.562.966,71
2.1.3.1	Jardim Coqueiros	-	207.015,49	207.015,49
2.1.3.2	Michigan	-	131.716,83	131.716,83
2.1.3.3	Loteamento Chácaras Araújo	1.487.256,06	-	1.487.256,06
2.1.3.4	Loteamento Santa Maria	1.250.994,69	-	1.250.994,69
2.1.3.5	Loteamento Santa Herminia	1.583.883,95	327.348,07	1.911.232,02
2.1.3.6	Bairro Primavera	1.484.848,00	-	1.484.848,00
2.1.3.7	Pousada do Vale	-	5.186.721,80	5.186.721,80
2.1.3.8	Bairro Majestic - Trecho 1	-	903.181,82	903.181,82
2.1.5	Canal Aberto do Córrego Lavapés	-	3.178.621,89	3.178.621,89
2.1.6	Drenagem Jd. Augusta	5.080.377,00	-	5.080.377,00
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	55.812.550,72	68.045.328,75	123.857.879,47
2.2.1	Obras Viárias	54.442.444,45	65.758.606,55	120.201.051,00
2.2.1.1	Via Oeste	-	1.557.296,09	1.557.296,09
2.2.1.2	Viaduto Santa Inês	-	5.277.969,15	5.277.969,15
2.2.1.3	Via Norte	1.231.243,12	9.561.835,67	10.793.078,79
2.2.1.4	Via do Banhado - Projeto (Obra fora do Programa)	-	1.321.278,58	1.321.278,58
2.2.1.5	Sistema Viário Cambuí-Saigiro Nakamura	31.686.573,53	37.776.783,64	69.463.357,17
2.2.1.6	Duplicação do Viaduto Kanebo	7.378.127,10	-	7.378.127,10
2.2.1.6.1	Duplicação Viaduto Kanebo - Bairro-Centro	3.960.497,10	-	3.960.497,10
2.2.1.6.2	Duplicação Viaduto Kanebo - Centro-Bairro	3.417.630,00	-	3.417.630,00



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Cód.	Descrição	BID (US\$)	PMSIC (US\$)	TOTAL (US\$)
2.2.1.7	Duplicação da Ponte Maria Peregrina	-	4.521.331,00	4.521.331,00
2.2.1.9	Ampliação da Malha Cicloviária	10.878.788,00	-	10.878.788,00
2.2.1.13	Ligação Leste-Sudeste	-	5.742.112,42	5.742.112,42
2.2.1.14	Requalificação Urbana	3.267.712,70	-	3.267.712,70
2.2.2	Gestão do Trânsito - Controle Central de Operações	1.180.477,46	1.255.698,81	2.436.176,27
2.2.2.1	Centrais Semafóricas	342.256,60	1.098.358,65	1.440.615,25
2.2.2.2	Prédio do Controle Central de Operações	838.220,86	157.340,16	995.561,02
2.2.3	Sistema Integrado de Transporte Público	68.911,29	256.592,97	325.504,26
2.2.3.1	ECO - Campos de São José	-	101.449,90	101.449,90
2.2.3.3	Sistema de Gestão de Transportes Concedidos	-	155.143,07	155.143,07
2.2.3.5	Software de Mapas dos Pontos de Ônibus	68.911,29	-	68.911,29
2.2.4	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes	120.717,52	51.401,18	172.118,70
2.2.4.1	Melhorias de Recursos Materiais	120.717,52	-	120.717,52
2.2.4.2	Campanha de Educação no Trânsito	-	51.401,18	51.401,18
2.2.5	TRM	-	25.701,44	25.701,44
2.2.6	Projetos de Engenharia (Malha Cicloviária e Ligação Leste-Sudeste)	-	697.327,80	697.327,80
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	3.121.712,42	11.925.740,07	15.047.452,49
2.3.1	Gestão de Tecnologia da Informação	-	169.006,28	169.006,28
2.3.1.1	Plano Diretor de Informática	-	88.494,27	88.494,27
2.3.1.2	Biblioteca de Metadados	-	80.512,01	80.512,01
2.3.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação	3.100.131,40	284.794,32	3.384.925,72
2.3.2.1	Sistema de Armazenamento e Processamento de Dados	1.561.872,05	66.974,65	1.628.846,70
2.3.2.2	Sistema Gerenciador de Banco de Dados	1.323.616,57	217.819,67	1.541.436,24
2.3.2.4	Sistema de Segurança de Dados Backup Site	214.642,78	-	214.642,78
2.3.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico	-	11.146.496,62	11.146.496,62
2.3.3.1	Gestão Fiscal Integrada - Novo SIFR	-	2.300.146,17	2.300.146,17
2.3.3.2	Sistema de ISS Eletrônico	-	1.338.080,95	1.338.080,95
2.3.3.6	Solução Tecnológica de Gestão Financeira	-	7.508.269,50	7.508.269,50
2.3.5	Gestão Cadastral	21.581,02	325.442,85	347.023,87
2.3.5.1	Reestruturação Cadastral	21.581,02	-	21.581,02
2.3.5.3	Indexação e Digitalização de Mapas e Documentos	-	105.561,20	105.561,20
2.3.5.5	Pesquisa Socioeconômica	-	219.881,65	219.881,65
Total		85.672.400,00	92.353.800,00	178.026.200,00
		48,12%	51,88%	100,00%



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

5.2 Quadro de Origem e Aplicação de Recursos Anual

O quadro de origem e aplicação de recursos, ano a ano, desde os reconhecimentos de contrapartida em 2009, é apresentado nesta e na próxima página. Os valores estão em US\$.

CATEGORIA DE INVERSÃO	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	-	-	17.272,59	-	35.401,13	49.043,72
1.1 - AUDITORIA, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, UGP, FISCALIZAÇÃO	-	-	17.272,59	-	35.401,13	49.043,72
2 - CUSTOS DIRETOS	13.299.087,61	9.421.965,72	2.507.259,14	4.867.730,96	5.359.539,75	3.442.589,53
2.1 - MELHORIAS URBANO-AMBIENTAIS	3.614.723,83	22.291,11	229.433,76	3.279.967,60	1.030.847,26	885.423,25
2.2 - MELHORIAS NA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO	9.567.483,47	7.167.261,02	1.251.200,91	864.970,28	2.686.594,30	1.093.854,88
2.3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	116.880,31	2.232.413,59	1.026.624,47	722.793,08	1.642.098,19	1.463.311,40
SUBTOTAL DO PROGRAMA	13.299.087,61	9.421.965,72	2.524.531,73	4.867.730,96	5.394.940,88	3.491.633,25
FUNDO ROTATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	13.299.087,61	9.421.965,72	2.524.531,73	4.867.730,96	5.394.940,88	3.491.633,25

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
TOTAL BID	980.359,36	250.883,76	-	3.905.479,50	3.625.084,02	2.546.091,01
TOTAL APOORTE LOCAL	12.318.728,25	9.171.081,96	2.524.531,73	962.251,46	1.769.856,86	945.542,24
TOTAL GERAL	13.299.087,61	9.421.965,72	2.524.531,73	4.867.730,96	5.394.940,88	3.491.633,25
% BID	7,4%	2,7%	0,0%	80,2%	67,2%	72,9%
% APOORTE LOCAL	92,6%	97,3%	100,0%	19,8%	32,8%	27,1%
% ANUAL	7,5%	5,3%	1,4%	2,7%	3,0%	2,0%



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

CATEGORIA DE INVERSÃO	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1 - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	52.542,90	127.544,19	3.072.589,63	2.093.675,65	190.444,19	5.638.514,00
1.1 - AUDITORIA, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO, UGP, FISCALIZAÇÃO	52.542,90	127.544,19	3.072.589,63	2.093.675,65	190.444,19	5.638.514,00
2 - CUSTOS DIRETOS	5.953.561,90	54.214.940,89	58.306.893,95	15.014.116,55	-	172.387.686,00
2.1 - MELHORIAS URBANO-AMBIENTAIS	3.841.618,84	14.507.772,73	6.070.275,66	-	-	33.482.354,04
2.2 - MELHORIAS NA MOBILIDADE DA POPULAÇÃO	1.996.762,76	38.419.142,91	48.299.248,87	12.511.360,07	-	123.857.879,47
2.3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	115.180,30	1.288.025,25	3.937.369,42	2.502.756,48	-	15.047.452,49
SUBTOTAL DO PROGRAMA	6.006.104,80	54.342.485,08	61.379.483,58	17.107.792,20	190.444,19	178.026.200,00
FUNDO ROTATIVO	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	6.006.104,80	54.342.485,08	61.379.483,58	17.107.792,20	190.444,19	178.026.200,00

	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
TOTAL BID	5.460.694,87	16.917.014,22	42.376.030,40	9.580.762,86	30.000,00	85.672.400,00
TOTAL APOORTE LOCAL	545.409,93	37.425.470,86	19.003.453,18	7.527.029,34	160.444,19	92.353.800,00
TOTAL GERAL	6.006.104,80	54.342.485,08	61.379.483,58	17.107.792,20	190.444,19	178.026.200,00
% BID	90,9%	31,1%	69,0%	56,0%	15,8%	48,1%
% APOORTE LOCAL	9,1%	68,9%	31,0%	44,0%	84,2%	51,9%
% ANUAL	3,4%	30,5%	34,5%	9,6%	0,1%	100,0%



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

5.3 Cronograma de Investimentos

O cronograma de investimentos é apresentado nos quatro quadros seguintes. Os valores estão em US\$.

Cód.	Descrição	2011 a 1º Sem 2016		2016			
		Total dos Anos	Acumulado	3º Trim	4º Trim	Total do 2º Sem	Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	190.053,70	190.053,70	-	91.750,83	91.750,83	281.804,53
1.1.1	UGP	17.272,59	17.272,59	-	-	-	17.272,59
1.1.2	Fiscalização das Obras Viárias	-	-	-	91.750,83	91.750,83	91.750,83
1.1.3	Monitoramento e Avaliação	71.107,38	71.107,38	-	-	-	71.107,38
1.1.4	Auditoria Anual	101.673,73	101.673,73	-	-	-	101.673,73
1.1.5	Apoio ao Gerenciamento	-	-	-	-	-	-
2	CUSTOS DIRETOS	63.778.312,50	63.778.312,50	10.458.688,41	24.829.674,51	35.288.362,92	99.066.675,42
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	19.570.128,75	19.570.128,75	1.865.745,43	5.976.204,19	7.841.949,62	27.412.078,37
2.1.1	Parques Urbanos	7.261.452,95	7.261.452,95	1.108.895,21	3.326.685,63	4.435.580,84	11.697.033,79
2.1.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos	963.354,64	963.354,64	-	-	-	963.354,64
2.1.3	Regularização de Loteamentos	8.166.699,27	8.166.699,27	756.850,22	2.649.518,56	3.406.368,78	11.573.068,05
2.1.5	Canal Aberto do Córrego Lavapés	3.178.621,89	-	-	-	-	-
2.1.6	Drenagem Jd. Augusta	-	-	-	-	-	-
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	36.888.882,41	36.888.882,41	8.280.098,42	17.878.289,70	26.158.388,12	63.047.270,53
2.2.1	Obras Viárias	33.232.053,94	33.232.053,94	8.280.098,42	17.878.289,70	26.158.388,12	59.390.442,06
2.2.2	Gestão do Trânsito - Controle Central de Operações	2.436.176,27	2.436.176,27	-	-	-	2.436.176,27
2.2.3	Sistema Integrado de Transporte Público	325.504,26	325.504,26	-	-	-	325.504,26
2.2.4	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes	172.118,70	172.118,70	-	-	-	172.118,70
2.2.5	TRM	25.701,44	25.701,44	-	-	-	25.701,44
2.2.6	Projetos de Engenharia (Malha Cicloviária e Uiação Leste-Sudeste)	697.327,80	697.327,80	-	-	-	697.327,80
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	7.319.301,34	7.319.301,34	312.844,56	975.180,62	1.288.025,18	8.607.326,52
2.3.1	Gestão de Tecnologia da Informação	169.006,28	169.006,28	-	-	-	169.006,28
2.3.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação	3.384.925,72	3.384.925,72	-	-	-	3.384.925,72
2.3.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico	3.638.227,12	3.638.227,12	312.844,56	938.533,68	1.251.378,24	4.889.605,36
2.3.5	Gestão Cadastral	127.142,22	127.142,22	-	36.646,94	36.646,94	163.789,16
	TOTAL GERAL	63.968.366,20	63.968.366,20	10.458.688,41	26.158.388,12	35.288.362,92	145.427.054,61
	BID	27.546.676,60	27.546.676,60	1.682.257,96	-	1.682.257,96	29.228.934,56
	PMSJC	36.421.689,60	36.421.689,60	8.776.430,45	-	8.776.430,45	45.198.120,05



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Cód.	Descrição	2017					Total do Ano	Acumulado
		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim			
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	619.198,45	871.048,32	791.171,43	791.171,43	3.072.589,63	3.544.447,86	
1.1.1	UGP	-	-	-	-	-	17.272,59	
1.1.2	Fiscalização das Obras Viárias	458.754,17	550.505,01	550.505,01	550.505,01	2.110.269,20	2.202.020,03	
1.1.3	Monitoramento e Avaliação	-	-	-	-	-	71.107,38	
1.1.4	Auditoria Anual	-	79.876,89	-	-	79.876,89	181.550,62	
1.1.5	Apoio ao Gerenciamento	160.444,28	240.666,42	240.666,42	240.666,42	58.306.893,95	157.373.569,37	
2	CUSTOS DIRETOS	21.573.268,20	12.795.774,61	12.345.703,15	11.592.147,99	6.070.275,66	33.482.354,03	
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	2.259.992,91	1.270.094,25	1.270.094,25	1.270.094,25	-	11.697.033,79	
2.1.1	Parques Urbanos	-	-	-	-	-	963.354,64	
2.1.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos	-	-	-	-	989.898,66	12.562.966,71	
2.1.3	Regularização de Loteamentos	989.898,66	-	-	-	-	-	
2.1.5	Canal Aberto do Córrego Lavapés	-	-	-	-	-	-	
2.1.6	Drenagem Jd. Augusta	1.270.094,25	1.270.094,25	1.270.094,25	1.270.094,25	-	-	
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	18.264.800,79	10.513.852,80	10.137.075,22	9.383.520,06	48.299.248,87	111.346.519,40	
2.2.1	Obras Viárias	18.264.800,79	10.513.852,80	10.137.075,22	9.383.520,06	48.299.248,87	107.689.690,93	
2.2.2	Gestão do Trânsito - Controle Central de Operações	-	-	-	-	-	2.436.176,27	
2.2.3	Sistema Integrado de Transporte Público	-	-	-	-	-	325.504,26	
2.2.4	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes	-	-	-	-	-	172.118,70	
2.2.5	TRM	-	-	-	-	-	25.701,44	
2.2.6	Projetos de Engenharia (Malha Cicloviária e Ligação Leste-Sudeste)	-	-	-	-	-	697.327,80	
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	1.048.474,50	1.011.827,56	938.533,68	938.533,68	3.937.369,42	12.544.695,94	
2.3.1	Gestão de Tecnologia da Informação	-	-	-	-	-	169.006,28	
2.3.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação	938.533,68	938.533,68	938.533,68	938.533,68	3.754.134,72	8.643.740,08	
2.3.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico	109.940,82	73.293,88	-	-	183.234,70	347.023,86	
2.3.5	Gestão Cadastral	22.192.466,65	13.666.822,93	13.136.874,58	12.383.319,42	61.379.483,58	160.727.963,53	
	TOTAL GERAL	17.822.411,57	8.237.790,87	8.157.913,98	8.157.913,98	42.376.030,40	76.061.637,13	
	BID	4.370.055,08	5.429.032,06	4.978.960,60	4.225.405,44	19.003.453,18	84.666.326,40	
	PMSJC							



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Cód.		Descrição	2018					Total do Ano	Acumulado
			1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim			
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		791.171,43	729.420,59	332.417,21	240.666,42	-	2.093.675,65	5.638.123,51
1.1.1	UGP		-	-	-	-	-	-	17.272,59
1.1.2	Fiscalização das Obras Viárias		550.505,01	458.754,17	91.750,79	-	-	1.101.009,97	3.303.030,00
1.1.3	Monitoramento e Avaliação		-	-	-	-	-	-	71.107,38
1.1.4	Auditoria Anual		-	30.000,00	-	-	-	30.000,00	211.550,62
1.1.5	Apoio ao Gerenciamento		240.666,42	240.666,42	240.666,42	240.666,42	-	962.665,68	962.665,68
2	CUSTOS DIRETOS		10.322.053,74	4.066.373,69	625.689,12	-	-	15.014.116,55	172.387.685,92
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais		-	-	-	-	-	-	33.482.354,03
2.1.1	Parques Urbanos		-	-	-	-	-	-	11.697.033,79
2.1.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos		-	-	-	-	-	-	963.354,64
2.1.3	Regularização de Loteamentos		-	-	-	-	-	-	-
2.1.5	Canal Aberto do Córrego Lavapés		-	-	-	-	-	-	-
2.1.6	Drenagem Jd. Augusta		-	-	-	-	-	-	-
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População		9.383.520,06	3.127.840,01	-	-	-	12.511.360,07	123.857.879,47
2.2.1	Obras Viárias		9.383.520,06	3.127.840,01	-	-	-	12.511.360,07	120.201.051,00
2.2.2	Gestão do Trânsito - Controle Central de Operações		-	-	-	-	-	-	2.436.176,27
2.2.3	Sistema Integrado de Transporte Público		-	-	-	-	-	-	325.504,26
2.2.4	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes		-	-	-	-	-	-	172.118,70
2.2.5	TRM		-	-	-	-	-	-	25.701,44
2.2.6	Projetos de Engenharia (Malha Cidoviária e Ligação Leste-Sudeste)		-	-	-	-	-	-	697.327,80
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional		938.533,68	938.533,68	625.689,12	-	-	2.502.756,48	15.047.452,42
2.3.1	Gestão de Tecnologia da Informação		-	-	-	-	-	-	169.006,28
2.3.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação		-	-	-	-	-	-	3.384.925,72
2.3.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico		938.533,68	938.533,68	625.689,12	-	-	2.502.756,48	11.146.496,56
2.3.5	Gestão Cadastral		-	-	-	-	-	-	347.023,86
TOTAL GERAL			11.113.225,17	4.795.794,28	958.106,33	240.666,42	-	17.107.792,20	177.835.755,73
BID			6.887.819,73	2.601.192,34	91.750,79	-	-	9.580.762,86	85.642.399,99
PMSIC			4.225.405,44	2.194.601,94	866.355,54	240.666,42	-	7.527.029,34	92.193.355,74



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Cód.	Descrição	2019		
		1º Quad	Total do Ano	Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	190.444,19	190.444,19	5.828.567,70
1.1.1	UGP	-	-	17.272,59
1.1.2	Fiscalização das Obras Viárias	-	-	3.303.030,00
1.1.3	Monitoramento e Avaliação	-	-	71.107,38
1.1.4	Auditoria Anual	30.000,00	30.000,00	241.550,62
1.1.5	Apoio ao Gerenciamento	160.444,19	160.444,19	1.123.109,87
2	CUSTOS DIRETOS	-	-	172.387.685,92
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	-	-	33.482.354,03
2.1.1	Parques Urbanos	-	-	11.697.033,79
2.1.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos	-	-	963.354,64
2.1.3	Regularização de Loteamentos	-	-	12.562.966,71
2.1.5	Canal Aberto do Córrego Lavapés	-	-	-
2.1.6	Drenagem Jd. Augusta	-	-	-
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	-	-	123.857.879,47
2.2.1	Obras Viárias	-	-	120.201.051,00
2.2.2	Gestão do Trânsito - Controle Central de Operações	-	-	2.436.176,27
2.2.3	Sistema Integrado de Transporte Público	-	-	325.504,26
2.2.4	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes	-	-	172.118,70
2.2.5	TRM	-	-	25.701,44
2.2.6	Projetos de Engenharia (Malha Cidoviária e Ligação Leste-Sudeste)	-	-	697.327,80
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	-	-	15.047.452,42
2.3.1	Gestão de Tecnologia da Informação	-	-	169.006,28
2.3.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação	-	-	3.384.925,72
2.3.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico	-	-	11.146.496,56
2.3.5	Gestão Cadastral	-	-	347.023,86
TOTAL GERAL		190.444,19	190.444,19	178.026.200,00
BID		30.000,00	30.000,00	85.672.400,00
PMSJC		160.444,19	160.444,19	92.353.800,00



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

6.1 Unidade de Gerenciamento do Programa

Para a administração do Programa, foi criada a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP. Para responder pela UGP, foi nomeada Rosa Maria Scaquetti Pinto como Coordenadora Geral.


6.2 Gerenciamento do Programa

A Prefeitura tem mobilizado pessoal do quadro funcional para a gestão e acompanhamento do Programa dentro da UGP. A título de apoio ao gerenciamento, o Instituto de Pesquisa, Administração e Planejamento (IPPLAN) prestou serviços à UGP para gestão do PEU, produzindo relatórios de progresso, relatórios síntese de projetos, editais e termos de referência para as licitações.

6.2.1 EQUIPE TÉCNICA PARA O GERENCIAMENTO

Através da Portaria nº 003/GP – DFAT/15 de 16 de março de 2015, o Prefeito Municipal nomeou para compor a UGP:

- Rosa Maria Scaquetti Pinto: Coordenadora do Programa. Responsável pelo planejamento e administração;
- Antônio Artur de Queiroz: responsável pelo planejamento, relatórios e apoio financeiro;
- Everton de Melo Felix: Coordenador do Componente Mobilidade;
- Milton Roberto: Coordenador de Fortalecimento Institucional;
- Carolina Dell Aquila Siqueira: Coordenadora do componente de melhorias urbanas e ambientais;
- Edson Fernandes da Silva: Coordenador do Setor Habitacional do Componente Melhorias Habitacionais;
- Marcelo Taranto Lopes: Gestor do Contrato do Programa, subordinado ao Gabinete do Prefeito.



7 ASPECTOS LICITATÓRIOS

A UGP elabora os editais e termos de referência para as licitações do Programa, com o apoio do IPPLAN e das secretarias do Município envolvidas na sua execução. Além destes documentos, todos os contratos e procedimentos licitatórios são efetuados seguindo-se as normas e padrões estabelecidos pelo Banco e pela legislação brasileira, ambos com a aprovação da Procuradoria Geral do Município.

As licitações acompanham as restrições e seguem as recomendações do BID, inclusive utilizando seus modelos de edital. O julgamento dos concorrentes é realizado pela Comissão Especial de Licitações da Prefeitura do Município de São José dos Campos, nomeada pela portaria nº2330/2016 de 29 de setembro de 2016, que é renovada anualmente, seguindo as recomendações do Banco. Todos os contratos referentes ao PEU são detalhados a seguir.

7.1 Administração do Programa

7.1.1 Auditoria, Monitoramento e Avaliação, UGP, Fiscalização

7.1.1.1 UGP

Foram contratadas nove empresas para entrega de equipamentos.

Empresa contratada Peelaert & Garcia – Gessos Acartonados LTDA ME, contrato nº 24890/11, no valor de R\$ 13.583,29. Contrato concluído.

Empresa contratada Itaotec S. A., contrato nº 24878/11, no valor de R\$ 7.245,00. Contrato concluído.

Empresa contratada Allen Rio Serviço e Comércio de Produtos de Informática LTDA, contrato nº 24346/11, no valor de R\$ 2.540,00. Contrato concluído.

Empresa contratada Requite Com. de Aces. para Móveis e Dec. LTDA, no valor de R\$ 1.590,00. Contrato concluído.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Empresa contratada Suprinet Suprimentos para Informática LTDA, no valor de R\$ 573,00.
Contrato concluído.

Empresa contratada Magalhães Equipamentos Comerciais LTDA - ME, no valor de R\$ 299,00. Contrato concluído.

Empresa contratada Diego Koloszuk Havelha Móveis- EPP, no valor de R\$ 6.443,20.
Contrato concluído.

Empresa contratada CLK Com. Serv. de Equip. para Segurança e Informática e Construção Civil LTDA ME, no valor de R\$ 320,00. Contrato concluído.

Empresa contratada NET MD Automação Industrial e Informática LTDA - EPP, no valor de R\$ 2.520,00. Contrato concluído.

7.1.1.2 Fiscalização das Obras Viárias

Termos de referência e editais para contratação das empresas de Supervisão de Obras (Lotes I e II) em análise pelo Banco. Enviados pelo Ofício nº 27/GP/APE/BID/2016, dia 31 de agosto de 2016. Valor estimado de US\$ 3.303.030,00.

7.1.1.3 Monitoramento

Contratação de serviço de consultoria para Elaboração do Plano de Reassentamento das famílias da Via do Banhado. Contratado Lincon Avelino de Barros, contrato nº 300/14, processo nº 19.812/14, celebrado em 29/08/2012, com duração de 4 meses, com valor de R\$ 79.300,00. O contrato está concluído.

Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica da Via Cambuí, processo nº 60733/15. Empresa contratada Luiz Cláudio de Souza Faria, contrato nº 2408/15 celebrado em 25/08/2015, com duração de 3 meses, valor de R\$ 65.000,00. O contrato está concluído.

Contratação do Estudo de Viabilidade Econômica da Via Cambuí em conjunto com a Rua Saigiro Nakamura. Empresa contratada Luiz Cláudio de Souza Faria, contrato nº 464/16,



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

processo nº 45715/16, celebrado em 24/05/2016, com prazo de 1 mês, valor de R\$ 65.000,00. Contrato concluído.

7.1.1.4 Auditoria Anual

Contratação de serviço de auditoria anual do Programa, processo nº 83842/12. Empresa contratada Loudon Blomquist, contrato nº 28057, celebrado em 25/08/2015, com duração de 25 meses, valor de R\$ 370.150,00. O contrato está em andamento.

7.1.1.5 Apoio ao Gerenciamento

Consultoria a licitar. Valor estimado de US\$ 2.005.553,41.

7.2 Custos Diretos: Componente 1 – Melhorias Urbano-Ambientais

7.2.1 Parques Urbanos


Centro de Lazer Ribeirão Vermelho: contratação da empresa Teixeira de Freitas Engenharia e Comércio LTDA, processo nº 17114/15, contrato nº 1883/15 celebrado em 17/07/15, valor da contratação R\$ 11.899.824,60. Prazo de execução é de 15 meses. Obra em andamento.

Contratação da empresa Kadima Engenharia LTDA EPP, contrato nº 26191/12, com início em 02/04/2012, valor da contratação R\$ 40.320,00. Prazo de execução de 3 meses. Projeto concluído.

Parque Boa Vista: contratação do Consórcio Idom-ACXT, contrato nº 26663/12, valor da contratação R\$ 374.170,98, celebrado em 17/07/15. Prazo de execução de 4 meses. Projeto concluído.

Contratação da empresa Serg Paulista Construções e Serviços Técnicos LTDA, processo nº 28535/15, contrato nº 1996/15, valor da contratação R\$ 11.417.242,24, celebrado em 06/07/2015. Prazo de execução é de 12 meses e a obra está em andamento.

Desapropriações no valor de R\$ 2.178.442,08.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Parque Roberto Burle Marx, compra de equipamentos: contratação da empresa Marprado Construção Civil LTDA ME, processo nº 114837/2015, contrato nº 427/16, valor da contratação R\$ 108.209,50, celebrado em 04/04/16. Prazo de execução de 1 mês. Contrato concluído.

7.2.2 Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos

PEV Campo dos Alemães: contratação da empresa Construtora Bugre LTDA, processo nº 17114/15, contrato nº 19150/08, valor da contratação R\$ 58.607,72, celebrado em 06/07/2015. Prazo de execução é de 2 meses obra concluída.


PEV Galo Branco: contratação da construtora Construjac Martins LTDA, processo nº 56675. Contrato nº 19218/08, valor da contratação R\$ 66.478,22, celebrado em 26/08/2008 com prazo de execução de 2 meses, obra concluída.

PEV Interlagos: contratação da Exímia Construtora LTDA, Processo nº 70017-7/08, contrato nº 19271/08 celebrado em 05/09/2008, valor da contratação de R\$ 57.800,00, com prazo de execução de 2 meses, obra concluída.

PEV 31 de Março: contratação da construtora L. G. Alves Construções e Manutenção LTDA, processo nº 81553-5/08, contrato nº 19782/08 celebrado em 11/12/2008, valor da contratação R\$ 86.591,04, com prazo de execução de 3 meses, obra concluída.

PEV Satélite: contratação da construtora EXM Construtora e Incorporadora LTDA, Processo nº 66746-3/10, contrato nº 19782/08 celebrado em 21/09/2010, valor da contratação R\$ 163.500,00, com prazo de execução de 4 meses, obra concluída.

PEV Novo Horizonte: contratação da construtora Nowa Construtora & Serviços LTDA EPP, processo nº 66745-5/10, contrato nº 23083/10 celebrado em 21/09/2010, valor da contratação com aditivo de R\$ 156.244,24, com prazo de execução de 4 meses, obra concluída.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

PEV Altos de Santana (Telespark): contratação da construtora EXM Construtora e Incorporadora LTDA, contrato nº 23088/10 celebrado em 21/09/2010, valor da contratação R\$ 155.359,00, com prazo de execução de 4 meses, obra concluída.

PEV Vila Progresso: contratação da construtora Vmax Engenharia e Construções LTDA, processo nº 11686/12, contrato nº 26510, celebrado em 10/05/2012, valor da contratação R\$ 276.131,76, com prazo de execução de 3 meses, obra concluída.

PEV Jardim Jaci: contratação da construtora Alianza Gerenciamento e Engenharia LTDA, processo nº 11686/12, contrato nº 26488, celebrado em 07/05/2012, valor da contratação R\$ 199.958,81, com prazo de execução de 3 meses, obra concluída.

PEV Residencial União: contratação da Construtora Bugre LTDA, processo nº 11686/12, contrato nº 26485, celebrado em 04/05/2012, valor da contratação R\$ 522.277,98, com prazo de execução de 3 meses, obra concluída.

PEV Dom Pedro II: contratação da Construtora Bugre LTDA, Processo nº 11686/12, contrato nº 26485, celebrado em 04/05/2012, valor da contratação R\$ 525.654,54, com prazo de execução de 3 meses, obra concluída.

Compra de caçambas para todos os PEVs da Fase 2: contratação da empresa Hozt Indústria de Máquinas e Equipamentos LTDA – ME, contrato nº 27869/12, celebrado em 10/05/2012, valor da contratação R\$ 38.000,00, com prazo de entrega de 1 mês, concluída.

PEV Jardim Copacabana: contratação da construtora EXM Construtora e Incorporadora LTDA, processo nº 28600/2015, contrato nº 1636/15, celebrado em 25/06/2015, valor da contratação R\$ 179.525,76, com prazo de execução de 4 meses, obra concluída.

7.2.3 Regularização de Loteamentos

Jardim Coqueiros: contratação da empresa Junbar Construções & Manutenção LTDA, processo nº 11686/12, contrato nº 81484-9, celebrado em 10/12/2008, valor da contratação R\$ 349.557,26, com prazo de execução de 4 meses, obra concluída.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Michigan: contratação da empresa Junbar Construções & Manutenção LTDA, processo nº 81484-9, contrato nº 19777/08, celebrado em 10/12/2008, valor da contratação R\$ 204.780,94, com prazo de execução de 3 meses, obra concluída.

Loteamento Chácaras Araújo: contratação da construtora Crisciuma Companhia Comercial LTDA, processo nº 29825/12, contrato nº 26981, celebrado em 16/07/2012, valor da contratação R\$ 3.060.635,89, com prazo de execução de 21 meses, obra concluída.

Loteamento Santa Maria: contratação da empresa Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi LTDA, processo nº 62206/14, contrato nº 1160/14, celebrado em 12/08/2014, valor da contratação R\$ 3.243.818,35, com prazo de execução de 24 meses, obra concluída.

Loteamento Santa Hermínia: contratação da empresa Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi LTDA, processo nº 63306/14, contrato nº 1644/14, celebrado em 19/08/2014, valor da contratação com aditivo de R\$ 5.140.252,73, com prazo de execução de 24 meses, obra concluída.

Pousada do Vale: contratação da empresa Átrio Construtora e Incorporadora LTDA, processo nº 39813/2014, contrato nº 1667/14, celebrado em 22/08/2014, valor da contratação de R\$ 15.152.541,54, com prazo de execução de 22 meses. Obra em andamento.

Bairro Primavera: publicado edital dia 18/08/16. Previsão para obras em dezembro de 2016. Valor estimado de US\$ 1.484.848,48.

Bairro Majestic, Trecho 1: contratação da empresa Land Vale Construções LTDA EPP, processo nº 88627/2015, contrato nº 3116/15, celebrado em 18/12/2015, valor da contratação de R\$ 2.980.499,99, com prazo de execução de 6 meses. Obra concluída, pagamentos em finalização.

Obras do Canal Aberto do Córrego Lavapés: contratação da construtora Urbanizadora Municipal S. A. – URBAM, processo nº 41677-0/08, contrato nº 18542/08, celebrado em



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

30/04/2008, valor da contratação R\$ 6.324.528,69, com prazo de execução de 17 meses, obra concluída.

Drenagem Jardim Augusta: Obra a licitar, com valor previsto de US\$ 5.080.376,55. Edital e termo de referência sendo finalizados. Início da licitação prevista para início de outubro de 2016 e obras para o final de dezembro.

7.3 Custos Diretos: Componente 2 – Melhorias na Mobilidade da População

7.3.1 Obras Viárias

Via Oeste: contratação da construtora Delta Construções S/A, processo nº 55648-0/07, contrato nº 18029/08, celebrado em 16/01/2008, valor da contratação R\$ 5.838.133,99, com prazo de execução de 6 meses, obra concluída.

Viaduto Santa Inês: contratação da construtora CCI Construções S/A, processo nº 73503-2/07, contrato nº 18832/08, celebrado em 04/03/2008, valor da contratação com aditivo R\$ 11.603.526,84, com prazo de execução de 20 meses, obra concluída.

Contratação da empresa Eletrowal Com. e Serviços de Eletricidade LTDA, processo nº 73503-2/07, contrato nº 22819/10, valor da contratação R\$ 202.000,00, com prazo de execução de 3 meses, obra concluída.

Via Norte: contratação da construtora Delta Construções S/A, processo nº 26860-4/07, contrato nº 18628/08, celebrado em 16/01/2008, valor da contratação com aditivo de R\$ 16.744.593,16, com prazo de execução de 32 meses, obra concluída.

Contratação da empresa R & B Construção e Manutenção LTDA - EPP, contrato nº 24416/11, valor da contratação R\$ 202.000,00, com prazo de execução de 1 mês, obra concluída.

Contratação da empresa MRS Logística S/A, contrato nº 22737/10, celebrado em 16/07/2010, valor da contratação R\$ 655.929,05, com prazo de execução de 6 meses, obra concluída.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Desapropriações no valor de R\$ 2.908.406,18.

Via do Banhado: atividade excluída do Programa na Alteração Contratual nº 1/2015, porém, projeto executivo havia sido realizado. Foi executado este serviço pelo consórcio formado pelas empresas Planservi Engenharia LTDA e COBRAPE, contrato nº 27843, celebrado em 24/11/2012, prazo de 8 meses, com valor de R\$ 4.668.644,24.

Sistema Viário Cambuí-Saigiro Nakamura: Relatório síntese e edital enviados ao Banco no dia 03/06/16. Licença Ambiental de Instalação obtida no dia 08/07/16, com condicionantes que estão em atendimento regular. Aguardando a não objeção do BID para licitar a obra. Previsão de efetivar o contrato em fevereiro de 2017. Valor estimado de US\$ 47.641.677,06.

Projetos e Licenciamento Ambiental: contratação do Consórcio Projeto Via Cambuí, processo nº 136659/12, contrato nº 27913, celebrado em 06/12/2012, valor da contratação com aditivo de R\$ 5.824.299,10, com prazo de execução de 24 meses. Projeto concluído.

Pagamentos relacionados às desapropriações em andamento. Valor estimado de US\$ 20.309.672,15 em contrapartida ao empréstimo BID.

Duplicação do Viaduto Kanebo Bairro-Centro: contratação da empresa Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi, processo nº 20434/15, contrato nº 1423/15, celebrado em 28/05/2015, valor da contratação R\$ 11.464.061,44, com prazo de execução de 12 meses, concluído.

Duplicação do Viaduto Kanebo Centro-Bairro: contratação da empresa Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi, processo nº 20743-0, contrato nº 24909/11, celebrado em 25/07/2011, valor da contratação com aditivos de R\$ 10.514.394,00, com prazo de execução de 8 + 21 meses, concluído.

Duplicação da Ponte Maria Peregrina: contratação da empresa Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi, processo nº 61439/2016, contrato nº 621/16, celebrado em 06/07/2016, valor da contratação de R\$ 14.920.392,85, com prazo de execução de 15 meses, em andamento.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Ampliação da Malha Ciclovária: obra com valor estimado em US\$ 10.878.788,00. Edital e relatório síntese sendo finalizados. Previsão de licitar no final de setembro de 2016.

Ligação Leste-Sudeste: contratação da empresa Souza Compec Engenharia Construções, processo nº 117265/2015, contrato nº 418/16, celebrado em 26/04/2016, valor da contratação com aditivo R\$ 20.266.211,56, com prazo de execução de 6 meses, contrato em andamento.

Requalificação Urbana – Novo Centro: contratação da empresa Stemmi Engenharia e Construções LTDA, processo nº 116202/2015, contrato nº 205/16, celebrado em 03/03/2016, valor da contratação R\$ 10.783.452,95, com prazo de execução de 6 meses, execução concluída e pagamentos sendo finalizados.

7.3.2 Gestão do Trânsito – Controle Central de Operações

Compra de Centrais Semafóricas: contratação da empresa Tesc Sistemas de Controle LTDA, processo nº 105452-2/09, contrato nº 21711/10, celebrado em 14/05/2013, valor da contratação R\$ 104.280,00, com prazo de execução de 12 meses, contrato concluído.

Contratação da empresa Brascontrol Indústria e Comércio LTDA, processo nº 105453-0/09, contrato nº 21740/10, celebrado em 22/01/2010, valor da contratação R\$ 183.716,00, com prazo de execução de 12 meses, contrato concluído.

Software de Integração das Centrais Semafóricas: contratação da empresa Tranzum Planejamento e Consultoria de Trânsito S/S LTDA, processo nº 29973/12, contrato nº 28569, celebrado em 14/05/2013, valor da contratação R\$ 718.245,66, com prazo de execução de 22 meses, contrato concluído.

Software Tempo Real: contratação da empresa Digicon S.A., processo nº 48996/12, contrato nº 26991, celebrado em 20/07/2012, valor da contratação R\$ 2.015.220,00, com prazo de execução de 4 meses, contrato concluído.



7.3.3 Prédio do Controle Central de Operações

Compra de Equipamentos Servidores: contratação da empresa Dalcom do Brasil Tecnologia e Infra-estrutura LTDA, processo nº 82777/13, contrato nº 29524, celebrado em 14/11/2013, valor da contratação R\$ 47.700,00, com prazo de execução de 2 meses, contrato concluído.

Contratação da empresa Full Prime Comércio e Serviços de Informática LTDA - ME, processo nº 72208/12, contrato nº 29524, celebrado em 25/10/2012, valor da contratação R\$ 119.990,00, com prazo de execução de 1 mês, contrato concluído.

Contratação da empresa Guimarães e Marques Suprimentos para Informática LTDA - EPP, processo nº 72208/12, contrato nº 27628, celebrado em 25/10/2012, valor da contratação R\$ 7.869,00, com prazo de execução de 1 mês, contrato concluído.

Contratação da empresa Sentran Serviços Especializados de Trânsito LTDA, processo nº 26240-7/09, contrato nº 20632/09, celebrado em 05/06/2009, valor da contratação R\$ 124.000,00, com prazo de execução de 2 meses, contrato concluído.


Contratação da empresa Sentran Serviços Especializados de Trânsito LTDA, processo nº 110629-8/09, contrato nº 22272/10, celebrado em 29/04/2010, valor da contratação R\$ 169.848,49, com prazo de execução de 2 meses, contrato concluído.

Montagem da Sala CCO: contratação da empresa G4S Monitoramento e Sistemas LTDA, processo nº 80949/12, contrato nº 27895, celebrado em 04/12/2012, valor da contratação R\$ 1.521.000,00, com prazo de execução de 4 meses, contrato concluído.

7.3.4 Sistema Integrado de Transporte Público

ECO - Campos de São José: contratação da empresa Paulo Grou Engenharia LTDA, processo nº 49795-1/09, contrato nº 21253/09, celebrado em 18/09/2009, valor da contratação R\$ 189.468,64, com prazo de execução de 3 meses, contrato concluído.

Sistema de Gestão de Transportes Concedidos: contratação da empresa Declink Desenvolvimento e Consultoria de Informática LTDA, processo nº 75944/13, contrato



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

nº 29743, celebrado em 28/11/2013, valor da contratação com aditivo em R\$ 751.618,31, com prazo de execução de 48 meses, contrato em andamento.

Software de Mapas dos Pontos de Ônibus: contratação da empresa LOGANN Soluções em Tecnologia de Automação e Informação LTDA, processo nº 6457/12, contrato nº 26124, celebrado em 29/02/2012, valor da contratação R\$ 124.000,00, com prazo de execução de 14 meses, contrato concluído.

7.3.5 Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes

Melhorias de Recursos Materiais: contratação da empresa Trafeg Sinalização e Segurança de Trânsito LTDA, processo nº 119005/2014, contrato nº 0775/15, valor da contratação R\$ 373.500,00, com prazo de execução de 12 meses, contrato concluído.

Campanha de Educação no Trânsito: contratação da empresa Em Trânsito Consultoria, processo nº 100538/2013, contrato nº 021/14, celebrado em 20/01/2014, valor da contratação R\$ 116.220,00, com prazo de execução de 12 meses, contrato concluído.

7.3.6 Transporte Rápido de Massa – TRM

Estudos sobre Modal para TRM: contratação da Fundação Casimiro Montenegro Filho, processo nº 80405-3/08, contrato nº 20282/09, celebrado em 17/03/2009, valor da contratação R\$ 48.000,00, com prazo de execução de 7 meses, contrato concluído.

7.3.7 Projetos de Engenharia

Projetos de Engenharia (Malha Cicloviária e Ligação Leste-Sudeste): contratação da empresa SGS Enger Engenharia LTDA, processo nº 136011/13, contrato nº 656/14, celebrado em 23/07/2014, valor da contratação R\$ 4.256.484,28, com prazo de execução de 12 meses. Contrato concluído.



7.4 Custos Diretos: Componente 3 – Fortalecimento Institucional

7.4.1 Gestão de Tecnologia da Informação

Plano Diretor de Informática: contratação da empresa Rhino Consultoria, processo nº 95766-9/11, contrato nº 25930/12, celebrado em 24/01/2012, valor da contratação R\$ 179.900,00, com prazo de execução de 7 meses, contrato concluído.

Biblioteca de Metadados: contratação da empresa Systemis Comércio de Software LTDA, processo nº 135460/11, contrato nº 25889/12, celebrado em 16/01/2012, valor da contratação R\$ 164.000,00, com prazo de execução de 6 meses, contrato concluído.

7.4.2 Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação

Equipamentos Servidores: contratação da empresa Officer Distribuidora de Produtos de Informática S. A., processo nº 101521/13, contrato nº 04114, celebrado em 30/01/2014, valor da contratação R\$ 69.000,00, com prazo de execução de 2 meses, contrato concluído.

Contratação da empresa PHD Sistemas de Energia Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA, processo nº 101521/13, contrato nº 02214, celebrado em 21/01/2014, valor da contratação R\$ 93.000,00, com prazo de execução de 2 meses, contrato concluído.

Software – SO e Virtualização: contratação da empresa Officer Distribuidora de Produtos de Informática S. A., Processo nº 48840/13, contrato nº 28889, celebrado em 30/01/2014, valor da contratação R\$ 284.597,94, com prazo de execução de 1 mês, contrato concluído.

Contratação da empresa Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática LTDA, processo nº 48840/13, contrato nº 28898, celebrado em 01/07/2013, valor da contratação R\$ 125.496,00, com prazo de execução de 1 mês, contrato concluído.

Equipamentos Backbone: contratação da empresa ACTV Comércio e Serviços LTDA EPP, processo nº 114812/13, contrato nº 00714, celebrado em 09/01/2014, valor da contratação R\$ 899.000,00, com prazo de execução de 2 meses, contrato concluído.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Equipamentos Geradores, AC, Nobreaks: contratação da empresa Officer Distribuidora de Produtos de Informática S. A., processo nº 101521/13, contrato nº 29514/13, celebrado em 08/11/2013, valor da contratação R\$ 2.153.466,00, com prazo de execução de 2 meses, contrato concluído.

Desenvolvimento de Sistemas: contratação da empresa Positivo Informática S.A, com valor de R\$ 13.933,50.

Compra de Servidor de Rede: contratação da empresa Mogi Trading Comércio de Aparelhos LTDA - ME, processo nº 90647-9/09, contrato nº 21581/09, celebrado em 15/12/2009, valor da contratação R\$ 116.505,00, com prazo de execução de 1 mês, contrato concluído.

Compra de Sistema Oracle Enterprise: contratação da empresa Ctis Tecnologia S.A., processo nº 48840/13, contrato nº 28790, celebrado em 14/06/2013, valor da contratação R\$ 2.678.999,94, com prazo de execução de 1 mês, contrato concluído.

Compra de Sistema Oracle: contratação da empresa Bertini do Brasil S.A., processo nº 90647-9/09, contrato nº 21571/09, valor de R\$ 166.800,00, com prazo de execução de 1 mês, contrato concluído.

Sistema de Segurança de Dados Backup Site: contratação da empresa Daten Tecnologia LTDA, processo nº 107344/2014, contrato nº 14840/14, com valor da contratação em R\$ 255.850,00, com prazo de entrega em 1 mês, contrato concluído.

Contratação da empresa Officer Distribuidora de Produtos de Informática S. A., contrato nº 29514/13 (mesmo dos Equipamentos Geradores, AC, Nobreaks). Contrato concluído.

7.4.3 Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico

Gestão Fiscal Integrada – Novo SIRF: contratação da empresa Kerion Engenharia e Sistemas S. A., processo nº 80417-0/09, contrato nº 21359/09, celebrado em 13/04/2010, valor da contratação com aditivos R\$ 5.602.496,38, com prazo de execução de 36 meses, contrato concluído.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Sistema de ISS Eletrônico: contratação da empresa Eicon Controles Inteligentes de Negócios LTDA., processo nº 47855-5/08, contrato nº 19486/08, celebrado em 16/10/2008, valor da contratação R\$ 2.499.000,00, com prazo de execução de 24 meses, contrato concluído.

Solução Tecnológica de Gestão Financeira: contratação da empresa NTC – Núcleo de Tecnologia e Conhecimento em Informática LTDA, processo nº 13143/2016, contrato nº 679/16, celebrado em 02/08/2016, valor da contratação R\$ 20.100.000,00 com prazo de execução de 24 meses, contrato em andamento.

7.4.4 Gestão Cadastral

Reestruturação Cadastral: contratação da empresa Rogério Thomé, processo nº 95056/12, contrato nº 27822, celebrado em 14/11/2012, valor da contratação R\$ 43.680,00, com prazo de execução de 7 meses, contrato concluído.

Indexação e Digitalização de Mapas e Documentos: contratação da empresa Digital Digitalização Transportes e Comércio LTDA ME, processo nº 57634/12, contrato nº 27594, celebrado em 08/10/2012, valor da contratação R\$ 256.999,90, com prazo de execução de 12 meses, contrato concluído.

Pesquisa Socioeconômica: contrato a licitar. Previsão de licitar em outubro de 2016 e contratar em dezembro. Valor estimado de US\$ 219.881,65.

7.5 Plano de Aquisições

O Plano de Aquisições, PA 17 Rev 1 2016 09 19, é apresentado no Anexo B.

8 CLÁUSULAS CONTRATUAIS

No quadro abaixo é mostrado o acompanhamento do cumprimento das cláusulas contratuais do Contrato de Empréstimo nº 2323/OC-BR.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

ITEM	CLÁUSULA	DESCRIÇÃO	VENCIMENTO VIGENTE	CUMPRIMENTO	APROVADO PELO BID
1	3.02	Condições especiais para o primeiro desembolso	18/02/2012	06/06/2010	27/09/2011
2	3.04	Prazo para o último desembolso	18/02/2017		
3	4.06	Relatório semestral de progresso	29/02/2012	29/02/2012	02/02/2012
4	4.06	Relatório semestral de progresso	30/08/2012	28/02/2012	03/09/2012
5	4.06	Relatório semestral de progresso	28/02/2013	18/01/2013	22/01/2013
6	4.06	Relatório semestral de progresso	30/08/2013	28/08/2013	04/09/2013
7	4.06	Relatório semestral de progresso	28/02/2014	28/02/2014	07/03/2014
8	4.06	Relatório semestral de progresso	30/08/2014	14/08/2014	21/08/2014
9	4.06	Relatório semestral de progresso	28/02/2015	27/03/2015	13/04/2015
10	4.06	Relatório semestral de progresso	30/08/2015	19/08/2015	09/09/2015
11	4.06	Relatório semestral de progresso	29/02/2016	29/02/2016	04/04/2016
12	4.06	Relatório semestral de progresso	30/08/2016	31/08/2016	
13	4.06	Relatório semestral de progresso	28/02/2017		
14	4.06	Relatório semestral de progresso	30/08/2017		
15	5.02	Demonstrações financeiras auditadas	30/04/2013		
16	5.02	Demonstrações financeiras auditadas	30/04/2014	25/04/2014	09/06/2014
17	5.02	Demonstrações financeiras auditadas	30/04/2015	30/04/2015	26/06/2015
18	5.02	Demonstrações financeiras auditadas	30/04/2016		
19	5.02	Demonstrações financeiras auditadas	30/04/2017		
20	4.01 A	Pareceres jurídicos	18/02/2012	29/08/2011	27/09/2011
21	4.01 B	Assinaturas autorizadas	18/02/2012	14/01/2011	27/09/2011
22	4.01 C	Lei orçamentária 1º ano civil	18/02/2012	14/01/2011	27/09/2011
23	4.01 D	Relatório inicial	18/02/2012	14/01/2011	27/09/2011
24	4.01 E	Plano de contas	18/02/2012	14/01/2011	27/09/2011
25	4.01 F	Concordância com auditoria pública independente	18/02/2012	14/01/2011	27/09/2011
26	4.01 G	Manter a alternativa de taxa de juros	18/02/2012	14/01/2011	27/09/2011
27	4.02	Prazo para o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso	18/02/2012	29/08/2011	27/09/2011
28	4.07	Fundo rotativo	17/01/2017		
29	6.04	Recursos adicionais	29/02/2012	15/02/2012	01/03/2012
30	6.04	Recursos adicionais	28/02/2013		
31	6.04	Recursos adicionais	28/02/2014	03/02/2014	07/02/2014
32	6.04	Recursos adicionais	28/02/2015	03/02/2015	10/02/2015
33	6.04	Recursos adicionais	29/02/2016		



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

9 ASPECTOS TÉCNICOS

9.1 Cronograma de Execução das Obras do Programa

Cód.	Descrição	Início	Meses	Término	2016			2017			2018			2019	
					dezembro	março	junho	setembro	dezembro	março	junho	setembro	dezembro	abril	
1	Administração do Programa	16/01/2013	77	22/04/2019											
1.1	Auditoria, Monitoramento, Avaliação, UGP, Fiscalização	16/01/2013	77	22/04/2019											
1.1.1	UGP		Concluído												
1.1.2	Fiscalização das Obras Várias	20/09/2016	32	22/04/2019											
1.1.3	Monitoramento e Avaliação		Concluído												
1.1.4	Auditoria Anual	16/01/2013	77	01/04/2019											
1.1.5	Apoio ao Gerenciamento	01/02/2017	26	01/01/2019											

Cód.	Descrição	Início	Meses	Término	2016			2017			2018			2019	
					dezembro	março	junho	setembro	dezembro	março	junho	setembro	dezembro	abril	
2	Custos Diretos	24/01/2012	81	21/04/2018											
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	24/01/2012	73	20/12/2017											
2.1.1	Parques Urbanos	24/01/2012	61	30/12/2016											
2.1.1.1	Centro de Lazer Ribeirão Vermelho	15/03/2012	59	15/12/2016											
2.1.1.2	Parque Boa Vista	24/01/2012	61	26/12/2016											
2.1.1.3	Parque Roberto Burle Marx	01/02/2016	10	30/12/2016											
2.1.2	Gestão de Resíduos da Construção Civil e Volumosos		Concluído												
2.1.2.1	Fase 1		Concluído												
2.1.2.2	Fase 2		Concluído												
2.1.2.3	Fase 3 - PEV Jardim Copacabana		Concluído												
2.1.3	Regularização de Loteamentos	22/04/2014	31	27/02/2017											
2.1.3.1	Jardim Coqueiros		Concluído												
2.1.3.2	Michigan		Concluído												
2.1.3.3	Loteamento Chikaras Araújo		Concluído												
2.1.3.4	Loteamento Santa Maria		Concluído												
2.1.3.5	Loteamento Santa Hermínia		Concluído												
2.1.3.6	Bairro Primavera	15/12/2016	3	27/02/2017											
2.1.3.7	Pousada do Vale	22/04/2014	25	21/04/2016											
2.1.3.8	Bairro Majestic - Trecho 1		Concluído												
2.1.5	Canal Aberto do Córrego Lavapés		Concluído												
2.1.6	Drenagem Id. Augusta	10/01/2017	12	20/12/2017											



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Cód.	Descrição	Início	Meses	Término	2016			2017			2018			2019	
					dezembro	março	junho	setembro	dezembro	março	junho	setembro	dezembro	abril	
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	16/04/2016	25	22/04/2018											
2.2.1	Obras Viárias	16/04/2016	25	22/04/2018											
2.2.1.1	Via Oeste		Concluído												
2.2.1.2	Viaduto Santa Inês		Concluído												
2.2.1.3	Via Norte		Concluído												
2.2.1.4	Via do Banhado - Projeto (Obra fora do Programa)		Concluído												
2.2.1.5	Sistema Viário Cambui-Saigiro Nakamura	02/02/2017	15	22/04/2018											
2.2.1.6	Duplicação do Viaduto Kanebo		Concluído												
2.2.1.6.1	Duplicação Viaduto Kanebo - Bairro Centro		Concluído												
2.2.1.6.2	Duplicação Viaduto Kanebo - Centro-Bairro		Concluído												
2.2.1.7	Duplicação da Ponte Maria Peregrina	04/07/2016	21	27/03/2018											
2.2.1.9	Ampliação da Malha Cicloviária	05/01/2017	5	10/05/2017											
2.2.1.13	Ligação Leste-Sudeste	26/04/2016	8	21/11/2016											
2.2.1.14	Requalificação Urbana		Concluído												
2.2.2	Gestão do Trânsito - Controle Central de Operações		Concluído												
2.2.2.1	Centrais Semafóricas		Concluído												
2.2.2.2	Prédio do Controle Central de Operações		Concluído												
2.2.3	Sistema Integrado de Transporte Público		Concluído												
2.2.3.1	ECO - Campos de São José		Concluído												
2.2.3.3	Sistema de Gestão de Transportes Concedidos		Concluído												
2.2.3.5	Software de Mapas dos Pontos de Ônibus		Concluído												
2.2.4	Melhorias Operacionais na Secretaria de Transportes		Concluído												
2.2.4.1	Melhorias de Recursos Materiais		Concluído												
2.2.4.2	Campanha de Educação no Trânsito		Concluído												
2.2.5	TRM		Concluído												
2.2.6	Projetos de Engenharia (Malha Cicloviária e Ligação Leste-Sudeste)		Concluído												



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Cód.	Descrição	Início	Meses	Término	2016			2017			2018			2019	
					dezembro	março	junho	setembro	dezembro	março	junho	setembro	dezembro	abril	
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	25/09/2016	24	25/08/2018											
2.3.1	Gestão de Tecnologia da Informação		Concluído												
2.3.1.1	Plano Diretor de Informática		Concluído												
2.3.1.2	Biblioteca de Metadados		Concluído												
2.3.2	Ações de Melhorias em Tecnologia da Informação		Concluído												
2.3.2.1	Sistema de Armazenamento e Processamento de Dados		Concluído												
2.3.2.2	Sistema Gerenciador de Banco de Dados		Concluído												
2.3.2.4	Sistema de Segurança de Dados Backup Site		Concluído												
2.3.3	Aperfeiçoamento de Serviços de Governo Eletrônico	25/09/2016	24	25/08/2018											
2.3.3.1	Gestão Fiscal Integrada - Novo SIF		Concluído												
2.3.3.2	Sistema de ISS Eletrônico		Concluído												
2.3.3.6	Solução Tecnológica de Gestão Financeira	25/09/2016	24	25/08/2018											
2.3.5	Gestão Cadastral	15/12/2016	6	15/05/2017											
2.3.5.1	Reestruturação Cadastral		Concluído												
2.3.5.3	Indexação e Digitalização de Mapas e Documentos		Concluído												
2.3.5.5	Pesquisa Socioeconômica	15/12/2016	6	15/05/2017											

No Anexo C, este cronograma é expandido mês a mês, até abril de 2019.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

10 ASPECTOS FINANCEIROS

10.1 Quadro de Investimento por Categoria de Inversão


Apresenta, de forma reduzida, a alocação dos investimentos por categoria de inversão do Programa.

10.2 Quadro de Controle de Desembolso

São apresentados os desembolsos ocorridos, por origem de aporte, com a respectiva participação percentual.

10.3 Quadro do Saldo Não Desembolsado

Demonstra os valores relativos ao saldo do Programa, ainda não desembolsado. São obtidos subtraindo-se os valores do “Item 10.1” pelos valores pagos do “Item 10.2”.



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Quadro de Investimento por Categoria de Inversão

CÓD.	CATEGORIA DE INVERSÃO	BID		PMSJC		TOTAL	
		US\$	%	US\$	%	US\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA						
1.1	Auditoria, Monitoramento e Avaliação, UGP, Fiscalização	3.615.688,00	2,03	2.022.826,00	1,14	5.638.514,00	3,17
		3.615.688,00	2,03	2.022.826,00	1,14	5.638.514,00	3,17
2	CUSTOS DIRETOS	82.056.712,00	46,09	90.330.974,00	50,74	172.387.686,00	96,83
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	23.122.448,86	12,99	10.359.905,18	5,82	33.482.354,04	18,81
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	55.812.550,72	31,35	68.045.328,75	38,22	123.857.879,47	69,57
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	3.121.712,42	1,75	11.925.740,07	6,70	15.047.452,49	8,45
	TOTAL	85.672.400,00	48,12	92.353.800,00	51,88	178.026.200,00	100,00




UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Quadro de Controle de Desembolso

CÓD.	CATEGORIA DE INVERSÃO	BID		SJC		TOTAL	
		US\$	%	US\$	%	US\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA						
1.1	Auditoria, Monitoramento e Avaliação, UGP, Fiscalização	172.781,11	0,26	17.272,59	0,03	190.053,70	0,29
		172.781,11	0,26	17.272,59	0,03	190.053,70	0,29
2	CUSTOS DIRETOS	27.977.831,47	42,67	37.395.347,93	57,04	65.373.179,40	99,71
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	12.725.578,99	19,41	7.448.485,74	11,36	20.174.064,73	30,77
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	12.130.540,06	18,50	25.749.273,27	39,27	37.879.813,33	57,78
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	3.121.712,42	4,76	4.197.588,92	6,40	7.319.301,34	11,16
	TOTAL	28.150.612,58	42,94	37.412.620,52	57,06	65.563.233,10	100,00



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID

Quadro do Saldo Não Desembolsado

CÓD.	CATEGORIA DE INVERSÃO	BID		SJC		TOTAL	
		US\$	%	US\$	%	US\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA						
1.1	Auditoria, Monitoramento e Avaliação, UGP, Fiscalização	3.442.906,89	3,06	2.005.553,41	1,78	5.448.460,30	4,84
		3.442.906,89	3,06	2.005.553,41	1,78	5.448.460,30	4,84
2	CUSTOS DIRETOS	54.078.880,53	48,09	52.935.626,07	47,07	107.014.506,60	95,16
2.1	Componente 1: Melhorias Urbano-Ambientais	10.396.869,87	9,24	2.911.419,44	2,59	13.308.289,31	11,83
2.2	Componente 2: Melhorias na Mobilidade da População	43.682.010,66	38,84	42.296.055,48	37,61	85.978.066,14	76,45
2.3	Componente 3: Fortalecimento Institucional	-	0,00	7.728.151,15	6,87	7.728.151,15	6,87
	TOTAL	57.521.787,42	51,15	54.941.179,48	48,85	112.462.966,90	100,00



UGP – BID

Unidade de Gerenciamento do Programa de
Estruturação Urbana de São José dos Campos / BID


Rosa Scazzetti
Coordenadora Operacional
UGP/BID
PMSJC - SP

Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Nacional	Método de Seleção	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Valor Estimado em R\$ mil	% de B.O.	% de Comparação	Caráter de Investimento	Método de Registro de Seleção	Data Estimada de Anúncio	Atualização do Contrato	Comentários (para Sistema Nacional incluir método de seleção)	Número PMCM	Status (Detecção)
2	PREFEITURA MUNICIPAL	4666 - SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ONIBUS	SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ONIBUS	Comparação de Preços (CP)	1	Nº 6457/12	68,91	100,0	0,0	2,2	Leilão	09/12	29/01/12	Comparação de Preços	BA8 9703	Contrato Concluído
21	PREFEITURA MUNICIPAL	4666 - SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ONIBUS	SOFTWARE DE MAPAS DOS PONTOS DE ONIBUS	Comparação de Preços (CP)	1	Nº 10943/0709	73,11	0,0	100,0	2,2	Leilão	22/01/10	22/01/10	Comparação de Preços	BA8 9703	Contrato Concluído
22	PREFEITURA MUNICIPAL	3553 - CENTRAIS SIMULADORAIS / COMPARAÇÃO DE CENTRAIS SIMULADORAIS /	COMPARAÇÃO DE CENTRAIS SIMULADORAIS /	Comparação de Preços (CP)	1	Nº 48996/12	1.025,25	55,3	44,7	2,2	Leilão	20/01/12	20/01/12	Comparação de Preços	BA8 9703	Contrato Concluído
23	PREFEITURA MUNICIPAL	3554 - CENTRAIS SIMULADORAIS / SOFTWARE - TITULO REAL	SOFTWARE TITULO REAL	Comparação de Preços (CP)	1	Nº 72204/12	248,08	35,5	64,5	2,2	Sistema Nacional	09/12	17/04/12	Preço Eletrônico	BA8 82166	Contrato Concluído
24	PREFEITURA MUNICIPAL	4916 - PREÇO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SERVIÇOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 82949/18	751,48	100,0	0,0	2,2	Sistema Nacional	04/12	04/01/12	Preço Eletrônico	BA8 82027	Contrato Concluído
25	PREFEITURA MUNICIPAL	3620 - PREÇO DO CONTROLE CENTRAL DE OPERAÇÕES / MONTAGEM DA SALA DA CCO	MONTAGEM DA SALA DA CCO	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 6806/12	4,69	100,0	0,0	2,1	Sistema Nacional	08/12	28/01/12	Preço Eletrônico	BA8 2126	Contrato Concluído
26	PREFEITURA MUNICIPAL	3728 - REVISTA MICROSOFT / COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 6806/12	4,69	100,0	0,0	2,1	Sistema Nacional	08/12	28/01/12	Preço Eletrônico	BA8 2126	Contrato Concluído
27	PREFEITURA MUNICIPAL	3727 - REVISTA MICROSOFT / COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 6806/12	4,69	100,0	0,0	2,1	Sistema Nacional	08/12	28/01/12	Preço Eletrônico	BA8 2126	Contrato Concluído
28	PREFEITURA MUNICIPAL	3726 - REVISTA MICROSOFT / COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 6806/12	4,32	0,0	100,0	2,1	Sistema Nacional	08/12	28/01/12	Preço Eletrônico	BA8 2126	Contrato Concluído
29	PREFEITURA MUNICIPAL	3265 - REVISTA MICROSOFT / COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	COMPARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (CÁMERA)	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 10131/13	355,34	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	08/01/13	Preço Eletrônico	BA8 2355	Contrato Concluído
210	PREFEITURA MUNICIPAL	3504 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 10131/13	99,46	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	08/01/13	Preço Eletrônico	BA8 2355	Contrato Concluído
211	PREFEITURA MUNICIPAL	4709 - SISTEMA DE SEGUANÇA DE DADOS BACKUP SITE / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 10131/13	115,18	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	08/01/13	Preço Eletrônico	BA8 2355	Contrato Concluído
212	PREFEITURA MUNICIPAL	3185 - SISTEMA DE SEGUANÇA DE DADOS BACKUP SITE / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 10131/13	72,93	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	08/01/13	Preço Eletrônico	BA8 2355	Contrato Concluído
213	PREFEITURA MUNICIPAL	4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SERVIÇOS	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 48840/13	214,22	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	14/01/13	Preço Eletrônico	BA8 82196	Contrato Concluído
214	PREFEITURA MUNICIPAL	4683 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / SERVIÇOS - SO E VIRTUALIZAÇÃO	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 48840/13	1.541,44	85,9	14,1	2,3	Sistema Nacional	09/13	14/01/13	Preço Eletrônico	BA8 82196	Contrato Concluído
215	PREFEITURA MUNICIPAL	4704 - SISTEMA DE SEGUANÇA DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 10131/13	514,66	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	08/01/13	Preço Eletrônico	BA8 82196	Contrato Concluído
216	PREFEITURA MUNICIPAL	4684 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 10131/13	514,66	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	08/01/13	Preço Eletrônico	BA8 82196	Contrato Concluído
217	PREFEITURA MUNICIPAL	4689 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
218	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
219	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
220	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
221	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
222	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
223	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
224	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
225	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
226	PREFEITURA MUNICIPAL	4688 - SISTEMA DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS / EQUIPAMENTOS - STORAGE	COMPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS STORAGE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 114412/13	404,72	100,0	0,0	2,3	Sistema Nacional	09/13	09/01/14	Preço Eletrônico	BA8 82364	Contrato Concluído
TOTAL																

SERVIÇOS QUE SÃO USADO DE CONSULTORIA									
3	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Atual	Método Seleção*	Quantidade de Lotes	Numero do Processo	Montante Estimado em US\$ e mil	Montante Estimado % BID	Contratada %
3.1	PREFEITURA MUNICIPAL	US-3 - CENTRO DE LAZER RECREIO YEMAMUHO / RECONSTRUÇÃO DOS PROJETOS	RECONSTRUÇÃO DOS PROJETOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 132425/11	21.50	0.0	100.0
3.2	PREFEITURA MUNICIPAL	US-3 - PLANO DIRETOR DE INFORMATICA / PLANO DIRETOR DE INFORMATICA	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE INFORMATICA	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 95166-9	88.49	0.0	100.0
3.3	PREFEITURA MUNICIPAL	US-3 - BIBLIOTECA DE METADADOS / BIBLIOTECA DE METADADOS	ELABORAÇÃO DA BIBLIOTECA DE METADADOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 131460	80.51	0.0	100.0
3.4	PREFEITURA MUNICIPAL	US-3 - INICIAÇÃO DE METADADOS / INICIAÇÃO DE METADADOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA INICIAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE MAPAS E DOCUMENTOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 15164/12	108.56	0.0	100.0
3.5	PREFEITURA MUNICIPAL	US-3 - SISTEMA DE GESTÃO DE TRANSPORTES / CONDIÇÕES /	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA	Sistema Nacional (SN)	1		143.86	0.0	100.0
3.6	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - PESQUISA SOCIOECONOMICA / PESQUISA SOCIOECONOMICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DE PESQUISA SOCIOECONOMICA	Sistema Nacional (SN)	1		219.88	0.0	100.0
TOTAL							660.80	0.0	660.80

CONSULTORIA FINANCIA									
4	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Atual	Método Seleção*	Quantidade de Lotes	Numero do Processo	Montante Estimado em US\$ e mil	Montante Estimado % BID	Contratada %
4.1	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	ESTUDOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 82053/09	25.70	0.0	100.0
4.2	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	PROJETOS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 951340/11	208.71	100.0	0.0
4.3	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 134542/12	806.54	0.0	100.0
4.4	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	PROJETOS E LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 136659/12	1.86/05	0.0	100.0
4.5	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA DAS CENTRAIS SIMULADORAS	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 29973/12	342.26	100.0	0.0
4.6	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA	Sistema Nacional (SN)	1		3.03/03	100.0	0.0
4.7	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 13842/12	181.42	100.0	0.0
4.8	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE	Sistema Nacional (SN)	1		50.02	0.0	100.0
4.9	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE	Sistema Nacional (SN)	1		32.76	0.0	100.0
4.10	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE	Sistema Nacional (SN)	1	Nº 117565/16	1.198.21	0.0	100.0
4.11	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA	Sistema Nacional (SN)	1		2.05/55	0.0	100.0
4.12	PREFEITURA MUNICIPAL	US-4 - FÁBRICA DE LIXO PARA TBM / FÁBRICA DE LIXO PARA TBM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AUDITORIA - PROMOÇÃO DE PREÇO DE DESMOLDO	Sistema Nacional (SN)	1		60.00	100.0	0.0
TOTAL							10.794.95	4.095.42	8.299.54

5	Unidade Executora *	Objeto *	Descrição Adicional	Método [Selecionar] *	Quantidade estimada de consultoria	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Pagamento [Selecionar] *	Data Estimada *		Constituição (para Sistema Nacional incluir método de seleção)	Número PIS/DA	Status [Selecionar]
						Montante Estimado em US\$ mil	% BID	% Contratada			Publicação de Edital de Chamada	Assinatura do Contrato			
5.1	PREFEITURA MUNICIPAL	402 - REESTRUTURAÇÃO CONTÁBIL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA CONCEPÇÃO ELABORAÇÃO APOIO AO REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	Comparação de Qualificação (3 CV)	1	R\$950.612	100,0	0,0	2.3	Ex-Ante	04/12	18/09/12		BA 10178	Contrato Concluído
5.2	PREFEITURA MUNICIPAL	1177 - REESTRUTURAÇÃO CONTÁBIL / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	Comparação de Qualificação (3 CV)	1	R\$198.274	100,0	0,0	1.1	Ex-Post	14/14	25/06/14		BA 10173	Contrato Concluído
5.3	PREFEITURA MUNICIPAL	7025 - CONSULTORIA / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	Comparação Direta (CD)	1	R\$607.315	100,0	0,0	1.1	Ex-Ante	14/15	01/07/15		BA 11048	Contrato Concluído
5.4	PREFEITURA MUNICIPAL	7026 - CONSULTORIA / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	Comparação Direta (CD)	1	R\$607.315	100,0	0,0	1.1	Ex-Ante	14/16	02/07/16			Contrato em Execução
TOTAL						912.82	91.28	-							

6	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método [Selecionar]*	Quantidade de lotes	Número do Processo	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Pagamento [Selecionar]*	Data Estimada*		Constituição (para Sistema Nacional incluir método de Seleção)	Número PIS/DA	Status [Selecionar]
							Montante em US\$ mil	% BID	% Contratada			Publicação de Edital de Chamada	Assinatura do Contrato			
TOTAL						-	-	-	-							

7	Unidade Executora *	Objeto *	Descrição Adicional	Método [Selecionar] *	Quantidade estimada de indígenas	Montante Estimado *			Categoria de Investimento	Método de Pagamento [Selecionar] *	Data Estimada *		Constituição (para Sistema Nacional incluir método de seleção)	Número PIS/DA	Status [Selecionar]
						Montante Estimado em US\$ mil	% BID	% Contratada			Assinatura do Contrato / Assinatura por Assinatura em Assinatura	Assinatura do Contrato			
7.1	PREFEITURA MUNICIPAL	1170 - PARQUE BOA VISTA / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	Comparação Direta (CD)		R\$ 633.866,06	100,0	0,0	2.1	Ex-Post	04/13	04/13			Contrato Concluído
7.2	PREFEITURA MUNICIPAL	7025 - CONSULTORIA / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	Comparação Direta (CD)	60	21.138.40	0,0	100,0	2.2						Contrato em Execução
7.3	PREFEITURA MUNICIPAL	7026 - CONSULTORIA / CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DOS TOM E APOIO DE ELABORAÇÃO DO PAVO DE REESTRUTURAMENTO DAS FAMILIAS DO BARRIO	Comparação Direta (CD)		1.211,24	100,0	0,0	2.2						Contrato Concluído
TOTAL						21.684,41	100,0	21,138,40							
